



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	3er. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	12
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	45
------------	---	---------------------	--	---------------	----

Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	26.67%
--------------------	---	-------------------------------------	--------

Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.
------------	--

Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ
--------------	---

Descripción de los resultados:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12.
--------------------------------	--

Justificación:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12, debido a que en este periodo no hubo licitaciones ni contratos en proceso.
----------------	---

CÉDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
M001	MEDIA SUPERIOR	REHABILITACIÓN EN LA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME	02/07/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S001	MEDIA SUPERIOR	ADQUISICION EN EL PLANTEL CONALEP IV CANCUN	CANCUN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO		13/08/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B014	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 2JUSTO SIERRA MENDEZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN		13/08/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	3er. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	12
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	45
------------	---	---------------------	--	---------------	----

Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	26.67%
--------------------	---	-------------------------------------	--------

Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.
------------	--

Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ
--------------	---

Descripción de los resultados:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12.
--------------------------------	--

Justificación:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12, debido a que en este periodo no hubo licitaciones ni contratos en proceso.
----------------	---

CÉDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
S019	SUPERIOR	CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR (OBRA EXTERIOR)	BACALAR	BACALAR	M.C.ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES		22/08/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S020	SUPERIOR	REHABILITACIÓN EN ELA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR (AIRES ACONDICIONADOS)	BACALAR	BACALAR	M.C.ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES		22/08/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S007	SUPERIOR	REHABILITACIÓN EN ELA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR (IMPERMEABILIZACION)	BACALAR	BACALAR	M.C.ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES			04/09/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	3er. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	12
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	45
------------	---	---------------------	--	---------------	----

Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	26.67%
--------------------	---	-------------------------------------	--------

Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.
------------	--

Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ
--------------	---

Descripción de los resultados:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12.
--------------------------------	--

Justificación:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12, debido a que en este periodo no hubo licitaciones ni contratos en proceso.
----------------	---

CÉDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
S018	SUPERIOR	P-1 SISTEMA DE MICROMOBILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	LA PRESUMIDA	JOSE MARIA MORELOS	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO			09/09/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S/C	MEDIA SUPERIOR	EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA PLANTEL IV	CANCUN	BENITO JUAREZ	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO			15/09/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
M003	MEDIA SUPERIOR	REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 11	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME			18/09/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	3er. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	12
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	45
------------	---	---------------------	--	---------------	----

Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	26.67%
--------------------	---	-------------------------------------	--------

Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.
------------	--

Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ
--------------	---

Descripción de los resultados:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12.
--------------------------------	--

Justificación:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12, debido a que en este periodo no hubo licitaciones ni contratos en proceso.
----------------	---

CÉDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
B029	BASICO	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA JOSE ESPAÑA CRUZ	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	ARQ. BRANDO FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ			25/09/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B121	BASICO	EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLEGREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS	COZUMEL	COZUMEL	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO			25/09/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
M004	MEDIA SUPERIOR	ADQUISICION EN EL PLANTEL CONALEP 102 FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO			25/09/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFAN WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	12	
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 45
Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	26.67%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.			
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12.			
Justificación:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12, debido a que en este periodo no hubo licitaciones ni contratos en proceso.			

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
M001	MEDIA SUPERIOR	REHABILITACIÓN EN LA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO
				ING. FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME
				07/07/2025

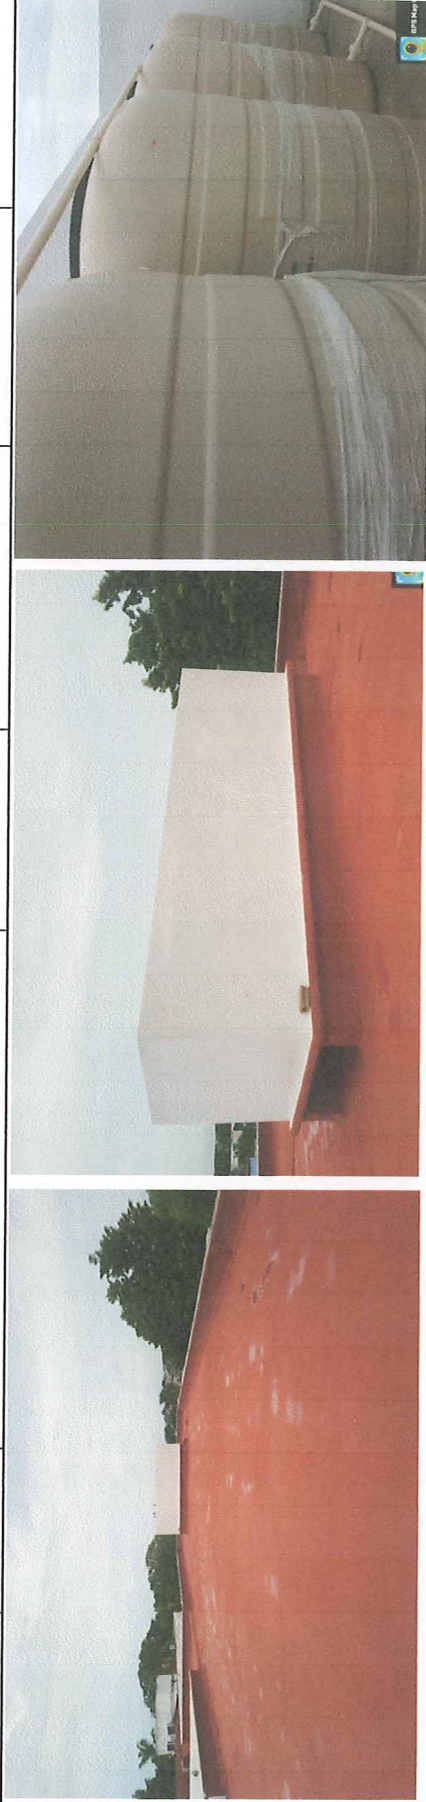



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, 68 y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra

(M001) REHABILITACION EN LA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS

Municipio:

OTHON P. BLANCO

Localidad:

CHETUMAL

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

FAM-REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE
COORDINACION Y COLABORACION PARA LA
POTENCIACION MEDIA SUPERIOR 2024

Siendo las 10:00 a.m. horas del día 02 del mes de Julio del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por la C. ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de Directora de Obras y Equipamiento, asistido por el C. FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento General en la Eva Samano de Lopez Mateos, a la SECRETARIA DE EDUCACION DE QUINTANA ROO representada por Laura Esther Arcevala Flores en su carácter de Directora de Plantel

Descripción breve de los trabajos: SE REALIZARON LOS TRABAJOS DEL DESPRENDIMIENTO DEL IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA LOSA PARA ELIMINAR MOHO PARTICULAS SUELTAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPUMA DE POLIURETANO ESPREADO RIGIDO DE ESPESOR DE 1", CARGA, ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE LOSA DE AZOTEA DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE INSERVIBLE, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMETRICO A DOS CAPAS COLOR TERRACOTA, DESMANTELAMIENTO DE TINACO REDONDOS DE ASBESTO, DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK VIDRIADO, CARGA Y ACARREO EN CAMION CON CARGA MECANICA 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, ACARREO DE MATERIAL KMS SUBSECUENTES PRODUCTO DE LA DEMOLICION, CIMBRA PARA LOSA ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO, CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRABES, ACERO DE REFUERZO DE DIAMETRO EN ESTRUCTURA #2, # 3, CONCRETO HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO DE 15X15CM, MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE 15X20X40CM ASENTADO CON MORTERO, CIMBRA PARA FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS ACABADO APARENTE, CHAFLAN DE CONCRETO EN AZOTEA DE 10X10CM, APLANADOS EN MUROS A 3 CAPAS ACABADO FINAL A BASE DE MORTERO, PINTURA VINILICA ACRILICA CALIDAD A PARA MUROS, PLAFONES, SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS TRICAPA EQUIPADO, INTERCONEXION Y DESCARGA DE 4 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE COBRE TIPO M DE 38 MM DE DIAMETRO, ETC.

El INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como tabla comparativa, presupuesto definitivo y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es al 02 de julio del 2026.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

I.F.E.Q.ROO.

C. Felipe Angel Grajales Jacome

Residente de Obra

SEQ

Ing. Jorge Alejandro Villanueva Canul

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

Laura Esther Arcevala Flores

Directora de Plantel



GOBIERNO DEL ESTADO
2022/2027



GOBIERNO DEL ESTADO
2022/2027



CENTRO DE ESTUDIOS DE
BACHILLERATO TÉCNICO
"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"
DIRECCIÓN DE PLANTEL




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
2022-2027

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	12
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 45
Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	26.67%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.			
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12.			
Justificación:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12, debido a que en este periodo no hubo licitaciones ni contratos en proceso.			

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
S001	MEDIA SUPERIOR	ADQUISICION EN EL PLANTEL CONALEP IV CANCUN	CANCUN	BENITO JUAREZ
				ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
				13/08/2025

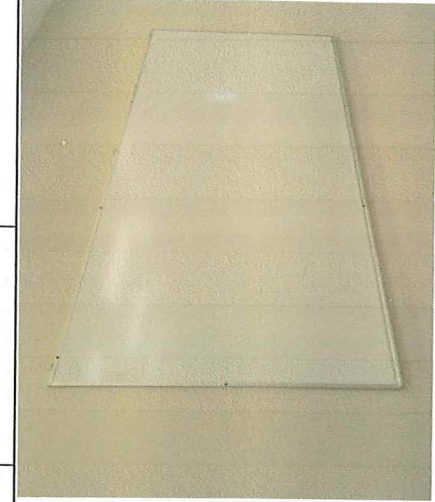



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables**, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra
Cédula y Nombre de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(S001) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Municipio: BENITO JUÁREZ Localidad: CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio: FAM-REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN SUPERIOR 2024

Siendo las 17:00 horas del día 13 del mes de agosto del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofía Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa de Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(S001) ADQUISICIÓN EN EL PLANTEL CONALEP CANCÚN IV con CCT 23ESU0004N**, representada por Maria Sanira Thomas Alcorex, en su carácter de Coordinadora Administrativa.

Descripción breve de la acción: (S001) Adquisición de mobiliario para 6 Aulas Didácticas, en la Universidad del Caribe, correspondiente al contrato IT-IFEQROO-ESOCAL-FAMSUPREM-ADQ-004/2025.

Beneficiados: 3,914 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE
LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: S001

PROGRAMA: FAM-REMANENTES
FAM DEL CONVENIO DE
COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN PARA
LA POTENCIACIÓN
SUPERIOR 2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	--------------	----	-------	------	-------

IT-IFEQROO-ESOCAL-FAMSUPREM-ADQ-004/2025

UNIC01	PIZARRÓN BLANCO DE 2.4 M X 1.2 M, MARCA INEPLASTIC, MODELO MELAMINICO	S/N	PIEZA	6	\$ 5,481.00	\$ 32,886.00
UNIC02	MESA BINARIA PARA MAESTRO, MARCA INEPLASTIC, MODELO 1.20*0.60	S/N	PIEZA	6	\$ 3,093.72	\$ 18,562.32
UNIC03	SILLA DE ESTUDIANTE, MARCA INEPLASTIC, MODELO ISO	S/N	PIEZA	246	\$ 1,260.92	\$ 310,186.32
UNIC04	MESA DE TRABAJO, MARCA INEPLASTIC, MODELO PICCOLO	S/N	PIEZA	240	\$ 4,117.42	\$ 988,180.80

TOTAL \$ 1,349,815.44

ENTREGA

NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN
FIRMA: Ana Sofia
SELLO:



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECIBE

NOMBRE: Mario Saniva Thome Alcocer
CARGO: Coordinadora Administrativa
FIRMA:

SELLO:





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	12	
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 45
Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	26.67%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.			
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12.			
Justificación:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12, debido a que en este periodo no hubo licitaciones ni contratos en proceso.			

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
B014	BASICO	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 2 JUSTO SIERRA MENDEZ	CHETUMAL	OTHÓN P.BLANCO
			SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
			ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN	13/08/2025





IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra (B014) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 JUSTO SIERRA MENDEZ

Municipio: OTHÓN P. BLANCO **Localidad:** CHETUMAL

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla () **Fondo o Convenio** FAM- FAM BASICO 2025

Siendo las 08:00 horas del día 13 del mes de agosto del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B014) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 JUSTO SIERRA MENDEZ representada por: C. MARTHA CRUZ TOLED en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: (B014) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 JUSTO SIERRA MENDEZ EN LA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: REHABILITACIÓN EN GENERAL

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

SEO

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
Escuela Secundaria Técnica No. 2
"JUSTO SIERRA MENDEZ"
Clave: 23DSRT0002R
CHETUMAL, Q. ROO




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
2022/2023

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P. CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	12
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 45
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	26.67%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.			
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12.			
Justificación:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12, debido a que en este periodo no hubo licitaciones ni contratos en proceso.			

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
S019	SUPERIOR	CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR (OBRA EXTERIOR)	BACALAR	BACALAR
			M.C.ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES	FECHA DE ENTREGA
				22/08/2025

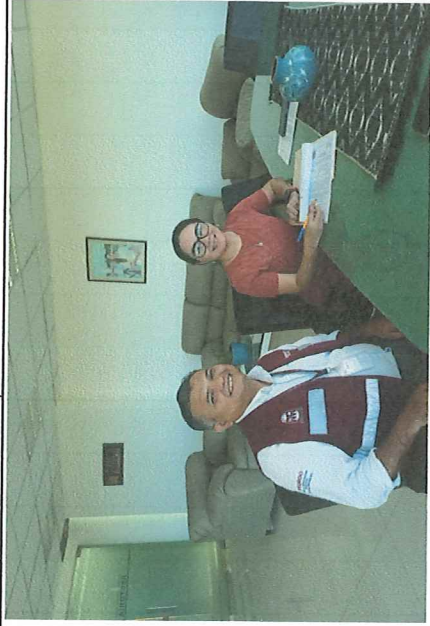



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Cédula y Nombre de la Obra (S019) CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR (OBRA EXTERIOR)

Municipio: BACALAR **Localidad:** BACALAR

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla () **Fondo o Convenio** FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION SUPERIOR 2023.

Siendo las 13:30 horas del día 22 del mes de Agosto del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por el M.C. ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (S019) CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR (OBRA EXTERIOR), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACALAR DEL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. representada por: la C. Dra. Ingrid Citlali Suárez Mc Liberty en su carácter de RECTORA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR.

Descripción breve de los trabajos OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADORES EN AREA DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES, ILUMINACION EXTERIOR, PINTURA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

M.C. ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

DRA. INGRID CITLALI SUAREZ MC LIBERTY
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR









SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	12
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 45
Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	26.67%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.			
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12.			
Justificación:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12, debido a que en este periodo no hubo licitaciones ni contratos en proceso.			

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
S020	SUPERIOR	REHABILITACIÓN EN ELA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR (AIRES ACONDICIONADOS)	BACALAR	BACALAR
				M.C.ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES
				22/08/2025

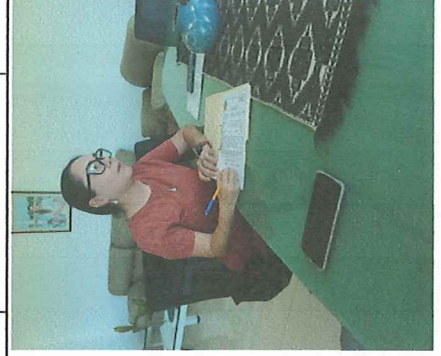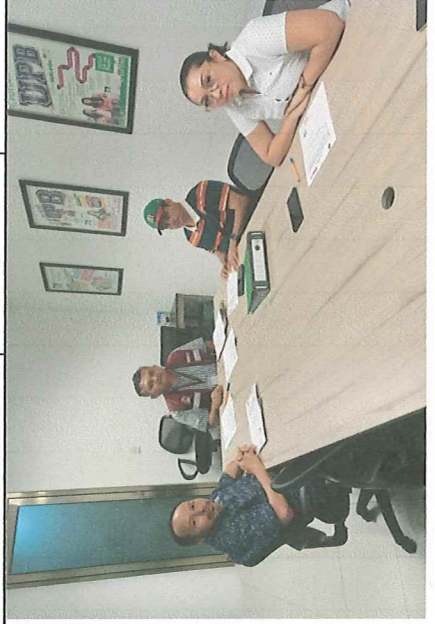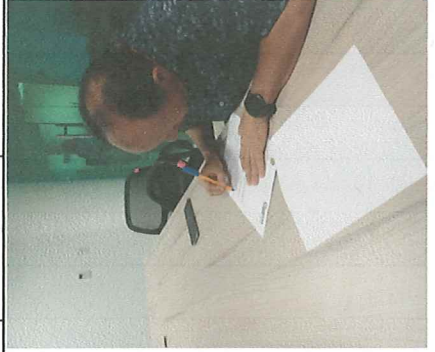



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO 2022|2027



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(S020) REHABILITACION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR (AIRES

Cédula y Nombre de la Obra

ACONDICIONADOS)

Municipio:

BACALAR

Localidad:

BACALAR

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

FAM- REMANENTES FAM DEL
CONVENIO DE COORDINACION
Y COLABORACION PARA LA
POTENCIACION SUPERIOR
2023.

Siendo las 13:30 horas del día 22 del mes de Agosto del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por el M.C. ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (S020) REHABILITACION EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR (AIRES ACONDICIONADOS), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACALAR DEL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, representada por: la C. Dra. Ingrid Citlali Suárez Mc Liberty en su carácter de RECTORA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR.

Descripción breve de los trabajos OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACION ELECTRICA Y BASES PARA AIRES ACONDICIONADOS

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

M.C. ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

DRA. INGRID CITLALI SUAREZ MC LIBERTY
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR







SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01




Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	12
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 45
Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	26.67%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.			
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12.			
Justificación:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12, debido a que en este periodo no hubo licitaciones ni contratos en proceso.			

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
S007	SUPERIOR	REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR (IMPERMEABILIZACIÓN)	BACALAR	BACALAR

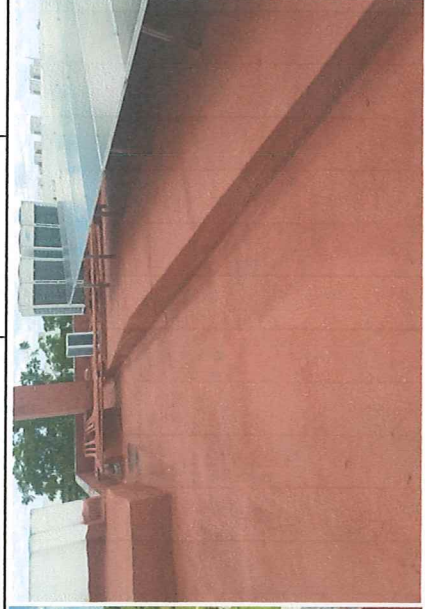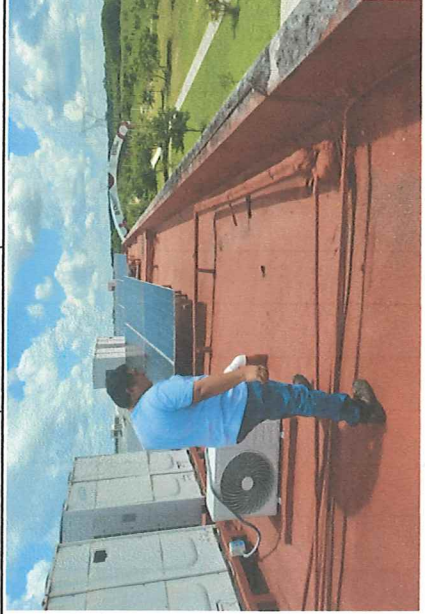

SUPERVISOR
M.C.ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES

FECHA DE ENTREGA
04/09/2025



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO 2022|2027



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra

(S007) REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR (IMPERMEABILIZACIÓN)

Municipio:

BACALAR

Localidad:

BACALAR

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

FAM- REMANENTES FAM DEL
CONVENIO DE COORDINACION
Y COLABORACION PARA LA
POTENCIACION SUPERIOR
2023.

Siendo las 10:30 horas del día 04 del mes de septiembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por el M.C. ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (S007) REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR (IMPERMEABILIZACIÓN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACALAR DEL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, representada por: la C. Dra. Ingrid Citlali Suárez Mc Liberty en su carácter de RECTORA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR.

Descripción breve de los trabajos OBRA: IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EN EDIFICIOS A Y B.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

IFEQROO


M.C. ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES

RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

DRA. INGRID CITLALI SUAREZ MC LIBERTY

RECTORA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

BACALAR

RECTORIA




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeegroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	12
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 45
Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	26.67%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.			
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12.			
Justificación:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12, debido a que en este periodo no hubo licitaciones ni contratos en proceso.			

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
S018	SUPERIOR	P-1 SISTEMA DE MICROMOBILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	LA PRESUMIDA	JOSÉ MARÍA MORELOS

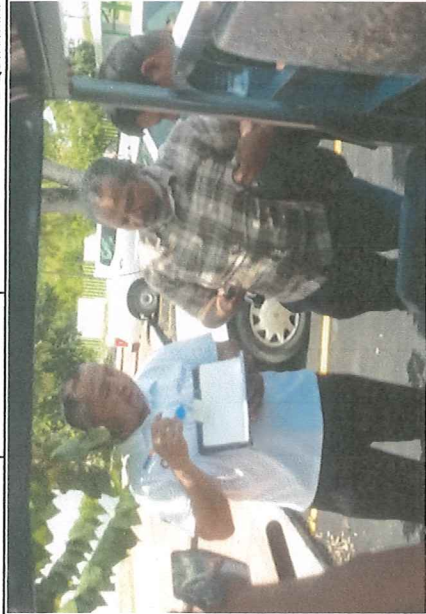

09/09/2025



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables**, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra
Cédula y Nombre de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(S018) P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD
INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

Municipio: JOSÉ MARÍA MORELOS

Localidad:

LA PRESUMIDA

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio: FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL SUPERIOR 2024

Siendo las 12:40 horas del día 09 del mes de Septiembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofia Calzada Quijano, en su Carácter de Encargada del Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(S018) P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO con CCT 23EIU0001J**, representada por Dr. William H. Briceño Guzmán, en su carácter de Rector.

Descripción breve de la acción: (S018) Equipamiento del Sistema de Micro Movilidad Sostenible Universitario en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, correspondiente al contrato LP-IFEQROO-SOLYLITIO-FAMSUP-ADQ-027/2024.

Beneficiados: 893 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Dr. William H. Briceño Guzmán
Rector
Nombre, Cargo y Firma

Sellos

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



C.C.T. 23EIU0001J

RECTORÍA



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL SUPERIOR 2024

LOCALIDAD: LA PRESUMIDA
MUNICIPIO: JOSÉ MARÍA MORELOS
CEDULA: S018

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	--------------	----	-------	------	-------

LP-IFEQROO-SOLYLITIO-FAMSUP-ADQ-027/2024

P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA

SISTM01	SISTEMA INTELIGENTE DE MICROMOVILIDAD UNIVERSITARIA, MARCA SOLMEX, MODELO SOLI-UIMQROO	S/N	SISTEMA	1	\$ 6,715,688.33	\$ 6,715,688.33
OBCIV	OBRA CIVIL Y DE ESTRUCTURAS METALICAS REQUERIDA PARA EL SISTEMA DE MICROMOVILIDAD UNIVERSITARIA, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PAQUETE	1	\$ 1,709,955.92	\$ 1,709,955.92

TOTAL \$ 8,425,644.25

ENTREGA

NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN
FIRMA: Ana Sofia
SELLO:



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECIBE

NOMBRE: Dr. William H. Briceño Guzmán
CARGO: Rector

FIRMA:

SELLO:



C.C.T. 23EIU0001J
RECTORÍA




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifegroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	12	
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 45
Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados: 26.67%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.			
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12.			
Justificación:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12, debido a que en este periodo no hubo licitaciones ni contratos en proceso.			

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
S/C	MEDIA SUPERIOR	EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA PLANTEL IV	CANCUN	BENITO JUAREZ
				ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
				15/09/2025

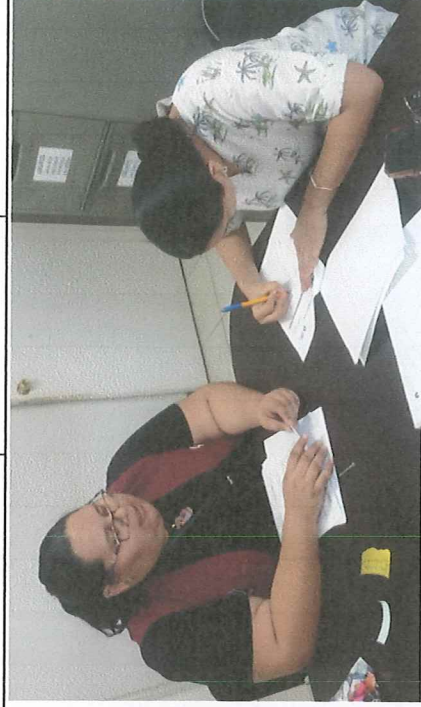



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Al plantel: Colegio de Educación Profesional Técnica Plantel IV

Con fundamento en los Artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 108 de su Reglamento, y numeral 4.3.1.1.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para formalizar la recepción física de adquisiciones de mobiliario y equipo del contrato número: IT-IFEQROO-YOALLIMARQUEZ-FAMMEDSUPPOT-ADQ-002/2025.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de Cancún, municipio Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo, siendo las 12:00 hrs del 15 de Septiembre del año 2025, se reunieron en las instalaciones del Colegio de Educación Profesional Técnica Plantel IV, las siguientes personas:

Por parte del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, la Arq. Tania Estefani Witzil Uh en su calidad de Directora de Obras y Equipamiento de IFEQROO.

Por otra parte, del plantel educativo Colegio de Educación Profesional Técnica Plantel IV se encuentra presente Lic. Elda Patricia Pérez Xix, quien recibe los bienes en su calidad de Directora del Plantel Colegio de Educación Profesional Técnica Plantel IV, manifestando que cuenta con las facultades bastantes y suficientes para comparecer a este acto en su nombre y representación.

II. GENERALIDADES DEL PLANTEL

Todos los antes señalados asisten a este acto de entrega recepción de mobiliario y/o equipo como representantes autorizados, manifestando contar con los conocimientos, las facultades y/o autorizados bastantes y suficientes para intervenir en su realización, y comprometiéndose a conducirse durante su desarrollo con probidad, honradez y de buena fe, siendo de su conocimiento lo siguiente:

GENERALIDADES DEL PLANTEL	
Plantel Escolar:	Colegio de Educación Profesional Técnica Plantel IV
Clave del Plantel:	23DPT00080
Localidad:	Cancún
Municipio:	Benito Juárez

III. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DE LA QUE PROVIENEN LOS BIENES O SERVICIOS QUE SE ENTREGAN

No. de Contrato	IT-IFEQROO-YOALLIMARQUEZ-FAMMEDSUPPOT-ADQ-002/2025
Oficio de autorización	D.I./0632/2025
Objeto de Contrato	EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA PLANTEL IV
Importe del contrato	\$ 2,107,062.28
Plazo:	60 días naturales
Fecha de inicio:	02 de Julio de 2025
Fecha de término:	30 de Agosto de 2025
Convenios formalizados:	-----



Objeto del Convenio:	-----
Importe del Convenio:	-----
Oficio de Autorización:	-----
Plazo de Convenio:	-----
Fecha de inicio:	-----
Fecha de término:	-----

IV. DATOS GENERALES DE LA INVERSIÓN APLICADA

Ejercicio fiscal del año:	2018
Inversión Federal:	1,059,194.50
TOTALES:	1,059,194.50

Se hace constar que se entrega a la o las personas que intervienen en el presente acto a nombre del plantel arriba señalado, por conducto de quienes intervienen en este acto a nombre y representación del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO lo siguiente:

V. ANEXOS DEL ACTA

Anexo 1	Documento de entrega de mobiliario
Anexo 2	Fichas técnicas

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGA EL MOBILIARIO Y/O EQUIPO, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Las personas que interviene en este acto, conforman mediante una inspección, recorrido y/o verificación física de la entrega de los bienes referidos en las tablas anteriores así como el cumplimiento de las especificaciones y/o características y cantidades de cada uno de los bienes suministrados, por concordar con la contratación contenida en esta ACTA y sus ANEXOS; y habiendo constatado en funcionamiento y buen estado de los mismos, son aceptados de conformidad por el plantel; asimismo quien recibe manifiesta explícitamente el compromiso de dar a lo recibido buen uso, conforme a su naturaleza, procurar el debido mantenimiento, ocupándose de su conservación, guarda, custodia, vigilar y en su caso sufragar su correcta operación, de modo que los bienes detallados en esta acta y sus anexos, a partir de este momento quedan bajo resguardo y responsabilidad de plantel que los recibe para su uso, operación y mantenimiento conforme a los objetivos y fines para los que fueron originalmente diseñados, para lo cual ya ha recibido los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes.

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

Los bienes detallados en esta acta, se encuentran garantizados con fianza, misma que permanece vigente hasta por un año contando a partir de la entrega recepción, para garantizar defectos y vicios ocultos de los bienes, calidad de los servicios y por cualquier otra irregularidad en que hubieren incurrido lo anterior conforme a lo señalado en el contrato.

Se consulta a los presentes si existen inconformidades u observaciones, a lo que respondieron: Se firma la presente Acta por el Suministro de Mobiliario y/o Equipo para Centros Educativos del Nivel Medio Superior del Estado, Contemplados En El Programa.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA




INIFED
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA




IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Por el plantel educativo


Proveedor



Lic. Elda Patricia Pérez
Directora del Plantel Colegio de Educación Profesional
Técnica Plantel IV




C. Yoalli Alejandra Márquez Villeda
Persona Física del Proveedor Yoalli Alejandra
Márquez Villeda

Testigos


Arq. Tania Estefani Witzil Uh
Directora de Obras y Equipamiento del Instituto de
Infraestructura Física Educativa del Estado de
Quintana Roo


Arq. Clayder Antonio Conrado Bracamonte
Subgerencia de Administración de Proyectos
Estatales de Infraestructura Educativa del INIFED en
el estado de Quintana Roo



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA PLANTEL IV

PROGRAMA: POTENCIACIÓN DE
LOS RECURSOS DEL
FAM "ESCUELAS AL
CIEN"

LOCALIDAD: CANCÚN

MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ

CEDULA: S/C

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
IT-IFEQROO-YOALLIMARQUEZ-FAMMEDSUPOT-ADQ-002/2025						

III.1

TALLER A Y B

TANQUE	TANQUE DE GAS 1600 LT, MARCA TATSA, MODELO 1600 LTS	HE67196	PZA	1	\$ 57,884.00	\$ 57,884.00
585470TU	AIRE ACONDICIONADO 01, MARCA TRANE, MODELO 4TXK6536G1000AA	2209H5550A, 2209H5573A, 2209H5687A, 2209H5628A, 2209H5658A, 2209H5698A, 2209H5629A, 2209H5627A	PZA	8	\$ 75,808.32	\$ 606,466.56
585470TJ	AIRE ACONDICIONADO 02, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PZA	8	\$ 5,810.44	\$ 46,483.52
585483	TUBERÍAS DE COBRE, MARCA NACOBRE, MODELO COMPATIBLES	S/N	ML	42	\$ 986.00	\$ 41,412.00

III.2

DIETOLOGÍA

TANQUE	TANQUE DE GAS 1600 LT, MARCA TATSA, MODELO 1600 LTS	HF41546	PZA	1	\$ 57,884.00	\$ 57,884.00
585470TU	AIRE ACONDICIONADO 01, MARCA TRANE, MODELO 4TXK6536G1000AA	2124H5073A, 2209H5642A, 2209H5580A, 2209H5670A, 2209H5635A	PZA	5	\$ 75,808.32	\$ 379,041.60
585470TJ	AIRE ACONDICIONADO 02, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PZA	5	\$ 5,810.44	\$ 29,052.20
585483	TUBERÍAS DE COBRE, MARCA NACOBRE, MODELO COMPATIBLES	S/N	ML	26	\$ 986.00	\$ 25,636.00
585464TU	AIRE ACONDICIONADO 12, MARCA TRANE, MODELO 4MXW1612A1000BA	4K20320003752	PZA	1	\$ 16,356.00	\$ 16,356.00
585464TJ	AIRE ACONDICIONADO 13, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 5,221.16	\$ 5,221.16

III.3

MOBILIARIO

BARRA	BARRA DE SERVICIO A MESEROS, MARCA INOXIDABLES FOMER, MODELO BASE280X130X90	S/N	PZA	1	\$ 114,724.00	\$ 114,724.00
-------	--	-----	-----	---	---------------	---------------



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA PLANTEL IV

PROGRAMA: POTENCIACIÓN DE
LOS RECURSOS DEL
FAM "ESCUELAS AL
CIEN"

LOCALIDAD: CANCÚN

MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ

CEDULA: S/C

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
ALACENA	ALACENA ALTA PARA VINOS, MARCA INOXIDABLES FOMER, MODELO AALPV460X40X40	S/N	PZA	1	\$ 74,644.84	\$ 74,644.84
GABINETE	GABINETE ANAQUEL ABIERTO / GABINETE DE PARED, MARCA INOXIDABLES FOMER, MODELO GAB3X70X180	S/N	PZA	1	\$ 91,524.00	\$ 91,524.00

III.4

TALLER DE VÍAS FERREAS

GABINETE:

P324310060300085,
P324310060300189,
P324310060300323,
P324310060300220,
P324310060300302,
P324310060300122,
P324310060300344,
P324310060300251,
P324310060300163,
P324310060300354,
P324310060300314,
P324310060300208,
P324310060300197,
P324310060300239

TARJETA MADRE

(MOBOS):

T3M0KC113278V9X,
T3M0KC1133629P7,
T3M0KC113194LG3,
T3M0KC113198V9X,
T3M0KC113280FVC,
T3M0KC113366K2L,
T3M0KC1133593CH,
T3M0KC113367M8X,
T3M0KC113363CM4,
T3M0KC113279RYF,
T3M0KC1133617JA,
T3M0KC113364FTY,
T3M0KC113206V4V,
T3M0KC1132582MN6

TABLERO

SIMULADOR: S/N

COMP001

COMPUTADORA DE ESCRITORIO,
MARCA OCELOT, MODELO
GLASS EW7
TABLERO SIMULADOR, MARCA
RAIL DRIVER DESKTOP CAB
CONTROLLER, MODELO RD-1384-
DCTS-R

PZA

14

\$

34,317.44

\$

480,444.16



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA PLANTEL IV

PROGRAMA: POTENCIACIÓN DE
LOS RECURSOS DEL
FAM "ESCUELAS AL
CIEN"

LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: S/C

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
MONITOR	MONITOR, MARCA CAPTIVE VIVID, MODELO AC-933841	3353338467099,	PZA	14	\$ 4,100.60	\$ 57,408.40
		3353338466596,				
		3353338466992,				
		3353338466991,				
		3353338466973,				
		3353338467019,				
		3353338466977,				
		3353338464243,				
		3353338466971,				
		3353338466978,				
		3353338466991,				
		3353338467103,				
		3353338466943,				
		3353338466983				
TECLADO	KIT TECLADO Y MOUSE, MARCA MSI, MODELO FORGE GK100 COMBO	S1104US20LHH910519	PZA	14	\$ 801.56	\$ 11,221.84
		000168,				
		S1104US20LHH910519				
		000184,				
		S1104US20LHH910519				
		000188,				
		S1104US20LHH910519				
		000166,				
		S1104US20LHH910519				
		000161,				
		S1104US20LHH910519				
		000181,				
		S1104US20LHH910519				
		000167,				
		S1104US20LHH910519				
		000190,				
		S1104US20LHH910519				
		000183,				
		S1104US20LHH910519				
		000169,				
		S1104US20LHH910519				
		000182,				
		S1104US20LHH910519				
		000186,				
		S1104US20LHH910519				
		000162,				
		S1104US20LHH910519				
		000170				



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO



OBRA: EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA PLANTEL IV

PROGRAMA: POTENCIACIÓN DE
LOS RECURSOS DEL
FAM "ESCUELAS AL
CIEN"

LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: S/C

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
AUDÍFONOS	AUDÍFONOS PARA GAMING, MARCA VORAGO, MODELO HEADSET501 (HS-501)	S/N	PZA	10	\$ 1,165.80	\$ 11,658.00

TOTAL \$ 2,107,062.28

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH	NOMBRE: Mtra. Elda Patricia Pérez Xix
CARGO: DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	CARGO: Directora
FIRMA:	FIRMA:
SELLO:	SELLO:
	



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	12
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 45
Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	26.67%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.			
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12.			
Justificación:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12, debido a que en este periodo no hubo licitaciones ni contratos en proceso.			

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
M003	MEDIA SUPERIOR	REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 11	CHETUMAL	ING. FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME
				ING. FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME
				18/09/2025





IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Cédula y Nombre de la Obra	(M003) REHABILITACION EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 11		
Municipio:	OTHÓN P. BLANCO	Localidad:	CHETUMAL
Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()	Fondo o Convenio		FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION MEDIA SUPERIOR 2024

Siendo las 10:00 horas del día 18 del mes de septiembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por C. FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (M003) REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 11 representada por: C. Maria Elena Arana Lope en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: (M003) REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 11, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN MUROS, LOGOTIPO GOBIERNO DE QUINTANA ROO, LOGOTIPO ESCUDO DEL ESTADO, LOGOTIPO NUEVO ACUERDO, LOGOTIPO INSTITUCIONAL, LOGOTIPO INTERNACIONAL DE DISCAPACITADOS EN COLOR AZUL, REHABILITACION DE PROTECTORES DE HERRERIA, ETC.

El INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.


Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento


FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME
RESIDENTE DE OBRA




Maria Elena Arana Lope
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	12
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 45
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	26.67%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.			
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12.			
Justificación:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12, debido a que en este periodo no hubo licitaciones ni contratos en proceso.			

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
M029	BASICO	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA JOSE ESPAÑA CRUZ	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	ARQ. BRANDO FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ	25/09/2025

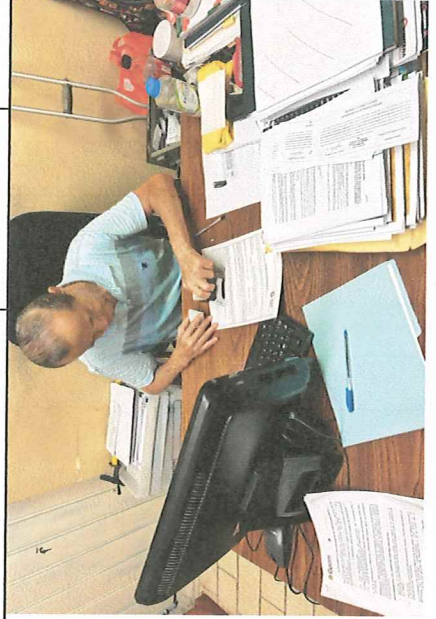



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO 202212027



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Edula y Nombre de la Obra

(B029) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA JOSE ESPAÑA CRUZ

Municipio:

PLAYA DEL CARMEN

Localidad:

PLAYA DEL CARMEN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

FAM-REMANENTES FAM DEL
CONVENIO DE COORDINACION Y
COLABORACION PARA LA
POTENCIACIÓN BASICO 2024

Siendo las **11:00** horas del día **25 del mes de Septiembre del año 2025**; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por **ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH** en su carácter de **DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO**, asistido por **ARQ. BRANDO FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ** en su carácter de **RESIDENTE DE OBRA**, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: **(B029) REHABILITACION EN LA SECUNDARIA JOSE ESPAÑA CRUZ** representada por: **PROF. VICTOR MANUEL BUENFIL ARANA** en su carácter de **DIRECTOR(A) DEL PLANTEL**.

Descripción breve de los trabajos OBRA: REHABILITACION EN LA SECUNDARIA JOSE ESPAÑA CRUZ

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

IFEQROO

ARQ. BRANDO FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N°21
"Jose España Cruz"
CCT. 230600027H
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q. ROO

PROF. VICTOR MANUEL BUENFIL ARANA
DIRECTOR DEL PLANTEL



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	12
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 45
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	26.67%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.			
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12.			
Justificación:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12, debido a que en este periodo no hubo licitaciones ni contratos en proceso.			

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
B121	BASICO	EQUIPAMIENTO ENEL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLEGREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS	COZUMEL	COZUMEL
				ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
				FECHA DE ENTREGA
				25/09/2025





ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables**, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra
Cédula y Nombre de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(B121) EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS

Municipio: COZUMEL Localidad: COZUMEL

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2024

Siendo las 11:10 horas del día 25 del mes de Septiembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofia Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa del Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(B121) EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS con CCT 23DML0024Z**, representada por María Guadalupe Dames Santana, en su carácter de Directora del CAM Leberci.

Descripción breve de la acción: **(B121) Equipamiento para Administración, en el Centro de Atención Múltiple Gregoria Eulogia Franco Vivas, correspondiente al contrato LP-IFEQROO-ROCEWI-FAMBAS-ADQ-009/2024.**

Beneficiados: 45 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

María Guadalupe Pima-Lentins
Directora del CRM Lobos,
Nombre, Cargo y Firma

Sellos

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
CALLE LABORAL TM ZONZ DS
GREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS
C.C.T. 23-0010247
QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN
MÚLTIPLE GREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS
LOCALIDAD: COZUMEL
MUNICIPIO: COZUMEL
CEDULA: B121

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
BÁSICO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	--------------	----	-------	------	-------

LP-IFEQROO-ROCEWI-FAMBAS-ADQ-009/2024

ADMINISTRACIÓN

MOB005-C	ESCRITORIO SEC, MARCA PUZA, MODELO ESC120	S/N	PZA	6	\$ 9,900.60	\$ 59,403.60
MOB005G-C	ESCRITORIO DIR, MARCA PUZA, MODELO EJ150	S/N	PZA	1	\$ 12,392.28	\$ 12,392.28
MOB006-C	SILLÓN EJECUTIVO3, MARCA OFFIHO, MODELO RIMINI	S/N	PZA	1	\$ 4,659.72	\$ 4,659.72
MOB007-C	SILLA SECRETARIAL, MARCA OFFIHO, MODELO OHS10	S/N	PZA	6	\$ 3,738.68	\$ 22,432.08
MOB009-C	ARCHIVERO METÁLICO, MARCA PUZA, MODELO ARCH4	S/N	PZA	6	\$ 10,219.60	\$ 61,317.60
MOB010-C	SILLA APILABLE, MARCA PUZA, MODELO STV01	S/N	PZA	20	\$ 1,773.64	\$ 35,472.80
MOB004A	CESTO METÁLICO, MARCA PUZA, MODELO CM-001	S/N	PZA	7	\$ 847.96	\$ 5,935.72
MOB012-C	ASTA DE BANDERA 2.30 M, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 1,663.44	\$ 1,663.44
MOB013-C	BANDERA NACIONAL PARA INTERPERIE, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 3,705.04	\$ 3,705.04
MOB014-C	BANDERA NACIONAL PARA INTERIORES, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 1,240.04	\$ 1,240.04
MOB015-C	PORTABANDERA, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 938.44	\$ 938.44
MOB016-C	MOÑO PARA BANDERA, MARCA DEPORTES HADAD, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 358.44	\$ 358.44
MOB427-C	NICHO PARA BANDERA, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 17,208.60	\$ 17,208.60
MOBG016-C	GABINETE METÁLICO, MARCA PUZA, MODELO GB-009	S/N	PZA	5	\$ 7,969.20	\$ 39,846.00
MOB029-C	ANAQUEL DE ESQUELETO DE SIETE ENTREPAÑOS, MARCA PUZA, MODELO AN-010	S/N	PZA	3	\$ 5,287.28	\$ 15,861.84
MOB309-C	COMPUTADORA, MARCA LENOVO, MODELO AIO IDE ACENTR E A 13	MP2DHSP6, MP2DHVWW	EQUIPO	2	\$ 33,304.76	\$ 66,609.52
MOB018-C	IMPRESORA TINTA, MARCA EPSON, MODELO ECOTANK L6270	X8G5143232	PZA	1	\$ 9,586.24	\$ 9,586.24
MOB018A-C	IMPRESORA LÁSER, MARCA HP, MODELO LASR JET PRO MFP 4103DW	CNCRS9W4CK, CNCRS9W5NM	PZA	2	\$ 11,887.68	\$ 23,775.36
MOB122-C	MESA PARA IMPRESORA, MARCA PUZA, MODELO MI-002	S/N	PZA	2	\$ 2,355.96	\$ 4,711.92



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN
MÚLTIPLE GREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS
LOCALIDAD: COZUMEL
MUNICIPIO: COZUMEL
CEDULA: B121

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
BÁSICO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
MOB021G	EXTINTOR A, MARCA EXTIN-DRY, MODELO 10	S/N	PZA	2	\$ 2,144.84	\$ 4,289.68
MOB031-C	BOTIQUÍN DE EMERGENCIA, MARCA PUZA, MODELO BO-01	S/N	PZA	2	\$ 2,279.40	\$ 4,558.80
MOB419-C	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PZA	2	\$ 1,617.04	\$ 3,234.08
MOB019A	SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PZA	2	\$ 324.80	\$ 649.60
MOB019B	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACIÓN, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PZA	2	\$ 324.80	\$ 649.60
MOB019C	SEÑAL DE PRIMEROS AUXILIOS, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PZA	2	\$ 324.80	\$ 649.60
MOB019E	SEÑAL DE EXTINTOR, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PZA	2	\$ 324.80	\$ 649.60
MOB020D	SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PZA	2	\$ 429.20	\$ 858.40
MOB019H	SEÑAL DE NO FUMAR, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PZA	3	\$ 324.80	\$ 974.40
MOB019L	SEÑAL DE USAR GEL ANTIBACTERIAL, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PZA	2	\$ 185.60	\$ 371.20

TOTAL \$ 404,003.64

ENTREGA

NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO

CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES
ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN

FIRMA: Ana Sofia

SELLO:



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECIBE

NOMBRE: Maria Guadalupe Damas Jankin

CARGO: Directora del CAM Laboral

FIRMA:

SELLO:

SEO

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
CAM LABORAL EN ZONA 05
GREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS
C.C. 1 23 DML00242
COZUMEL, QUINTANA ROO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	3er. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	12	
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 45
Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	26.67%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.			
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12.			
Justificación:	Para el tercer trimestre se tenía programado 45 actas plantel pero se lograron recabar 12, debido a que en este periodo no hubo licitaciones ni contratos en proceso.			

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
M004	MEDIA SUPERIOR	ADQUISICION EN EL PLANTEL CONALEP 102 FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
				FECHA DE ENTREGA
				25/09/2025





ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables**, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Cédula y Nombre de la Obra	(M004) ADQUISICIÓN EN EL PLANTEL CONALEP 102 FELIPE CARRILLO PUERTO		
	Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:
			FELIPE CARRILLO PUERTO
Origen del Recurso:	Estatad (X) Federal () Municipal () Mezcla ()		Fondo o Convenio:
			FAM - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTES DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA POTENCIACIÓN DE NIVEL MEDIA SUPERIOR 2024

Siendo las 18:00 horas del día 25 del mes de Septiembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofía Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa de Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(M004) ADQUISICIÓN EN EL PLANTEL CONALEP 102 FELIPE CARRILLO PUERTO con CCT 23DPT0003T**, representada por Montserrat Guadalupe Jiménez Cruz, en su carácter de Directora de Plantel.

Descripción breve de la acción: (M004) Adquisición de Horno de Panificación y Desmantelamiento de Horno, en el Plantel Conalep 102 Felipe Carrillo Puerto, correspondiente al contrato AD-IFEQROO-ESOCAL-FAMMEDSUPREM-ADQ-003/2025.

Beneficiados: 293 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Garcera Guadalupe
Jiménez Cruz
Directora de Plantel.

Nombre, Cargo y Firma

Sellos


Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: ADQUISICIÓN EN EL PLANTEL CONALEP 102 FELIPE
CARRILLO PUERTO
LOCALIDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO
MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO
CEDULA: M004

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
MEDIA SUPERIOR
REMANENTES 2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	--------------	----	-------	------	-------

AD-IFEQROO-ESOCAL-FAMMEDSUPREM-ADQ-003/2025

MOBILIARIO

DESM01	DESMANTELAMIENTO DE HORNO	S/N	PZA	1	\$ 4,280.40	\$ 4,280.40
HORNO01	HORNO DE CONVECCIÓN, MARCA SAN-SON, MODELO HCU-1	1024-2455	PZA	1	\$ 140,290.40	\$ 140,290.40

TOTAL \$ 144,570.80

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	NOMBRE: Monserrath Guadalupe Jiménez Cruz
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN	CARGO: Directora de Plantel
FIRMA: Ana Sofia	FIRMA: [Firma]
SELLO:	SELLO: [Sello]
