



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	4to. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
-----------------------------	---	-------------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	43
-----------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
------------	---	------------------------	--	---------------	----

Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
-----------------------	---	--	---------

Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.
------------	--

Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ
--------------	---

Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.
-----------------------------------	---

Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.
----------------	---

CÉDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
B266	BÁSICO	MOBILIARIO DE REPOSICIÓN EN VARIAS LOCALIDADES Y VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	VARIAS	VARIOS	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	01/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B055	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	XUL-HA	OTHÓN P. BLANCO	ING. JOEL MEX HERRERA	01/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B266	BÁSICO	MOBILIARIO DE REPOSICIÓN EN VARIAS LOCALIDADES Y VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	VARIAS	VARIOS	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	03/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACION DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CÉDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
B037	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. FELIPE ÁNGEL GRAJALES JACOME	09/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S/C	MEDIA SUPERIOR	CONSTRUCCION DE UNA BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 272	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN	16/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B020	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN	17/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B024	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER (EDIFICIO "A")	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. FDANIEL EDUARDO CEN CEN	17/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B024	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER (EDIFICIO "B")	CANCUN	BENITO JUAREZ	ING. FDANIEL EDUARDO CEN CEN	17/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
M002	MEDIA SUPERIOR	REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 111	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. FDANIEL EDUARDO CEN CEN	17/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B041	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR INSURGENTES	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. JOEL MEX HERRERA	17/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B080	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 IKAL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	17/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B071	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO KUSAMIL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	21/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B073	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	21/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B033	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR MOCTEZUMA	JOSÉ NARCISO ROVIROSA	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN	21/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B074	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	21/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B035	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA	PEDRO JOAQUÍN COLDWELL	OTHÓN P. BLANCO	ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB	21/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B075	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	21/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CÉDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
B076	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR CENTENO (TURNO VESPERTINO)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	21/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S008	SUPERIOR	ADQUISICIÓN EN LA UNIVERISDAD TECNOLÓGICA DE TULUM	TULUM	TULUM	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	22/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S025	SUPERIOR	ADQUISICIÓN EN LA UNIVERISDAD TECNOLÓGICA DE TULUM	TULUM	TULUM	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	22/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B019	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA	28/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
250275	BÁSICO	REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN, AULAS Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB	29/10/2025			ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B025	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA		04/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B054	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA KOHUNLICH (DOMO)	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB		10/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B036	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. FELIPE ÁNGEL GRAJALES JOCOME		12/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B043	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO (EDIFICIO B)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN		13/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B043	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO (SUBESTACIÓN)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN		13/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
240103	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN		13/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B043	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO (OBRA EXTERIOR)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN		13/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
240098	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN		13/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACION DE INDICADOR CO01ACT01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CÉDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
B078	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA BARRERA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO		19/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B079	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 43 KUSAMIL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO		20/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B077	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA U,NAHIL-XOOC	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO		20/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B081	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA ZAZIL BEH	HUAY MAX	JOSÉ MARÍA MORELOS	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO		24/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
250316	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA U,NAHIL-XOOC	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN		26/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B059	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA RAZA DE BRONCE	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA		26/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B109	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ FRANCISCO PACHECO TAMAYO	EL IDEAL	LÁZARO CÁRDENAS	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO		26/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B111	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS (TURNO VESPERTINO)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO		26/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B110	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JESÚS MARTÍNEZ ROSS	CALDERITAS	OTHÓN P. BLANCO	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO		27/11/2025		ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
250370	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR K'IMAC'OLAL	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. JORGE EFRAÍN CALDERÓN LLANES			02/12/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B100	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN			15/12/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B102	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN			15/12/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO
B119	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA INDÍGENA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ	TRAPICH	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. JORGE EFRAÍN CALDERÓN LLANES			16/12/2025	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Cédula y Nombre de la Obra	(B266) MOBILIARIO DE REPOSICIÓN EN VARIAS LOCALIDADES Y VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Municipio:	VARIOS	Localidad:	VARIAS
Origen del Recurso:	Estatad (X) Federal () Municipal () Mezcla ()	Fondo o Convenio	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2018

Siendo las 9:00 horas del día 01 del mes de Octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofía Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa de Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(B266) MOBILIARIO DE REPOSICIÓN EN VARIAS LOCALIDADES Y VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, TELESECUNDARIA OTHÓN P. BLANCO, EN LA LOCALIDAD XCALAK, EN EL MUNICIPIO OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** con CCT **23DTV0033V**, representada por L. Rogel Jimena Cruz, en su carácter de Directora del Plantel.

Descripción breve de la acción: Mobiliario de 3 escritorios para maestro, en la Telesecundaria Othón P. Blanco, correspondiente al contrato de LP-IFEQROO-GESCORPION-FAMBAS-ADQ-035/2018.

Beneficiados: 42 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y
mantenimiento

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa de Departamento de Bienes Adquiridos
en Tránsito y Almacén

Rogel Jure Cruz P

Nombre, Cargo y Firma

Sellos

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y
mantenimiento



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SEQ
Servicios Educativos de Q.Roo
Telesecundaria "Othón P. Blanco"
Clave 23DTV0033Y
Xcalak Q.Roo



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: MOBILIARIO DE REPOSICIÓN EN VARIAS LOCALIDADES Y
VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
LOCALIDAD: VARIAS
MUNICIPIO: VARIOS
CEDULA: B266

PROGRAMA: FAM BÁSICO 2018

CLAVE	DESCRIPCION	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	----	-------	------	-------


LP-IFEQROO-GESCORPION-FAMBAS-ADQ-035/2018


4	MESA PARA MAESTRO	PZA	3	\$2,960.40	\$ 8,881.20
---	-------------------	-----	---	------------	-------------

NOTA: SE ENTREGO EN LA CCT 23DTV0033Y TELESECUNDARIA
OTHÓN P. BLANCO, LOCALIDAD DE XCALAK, MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO

TOTAL: **\$8,881.20**

OBSERVACIONES: _____

ENTREGA NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO CARGO: JEFA DE DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN FIRMA: Ana Sofia SELLO:   	RECIBE NOMBRE: Angel Sincere Cruz CARGO: Director FIRMA:  SELLO: SEQ Servicios Educativos de Q.Roo Telesecundaria "Othón P. Blanco" Clave 23DTV0033Y Xcalak Q.Roo
--	--







SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre: 4to. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43	
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Denominador :	40	
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%	
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
B266	BÁSICO	MOBILIARIO DE REPOSICIÓN EN VARIAS LOCALIDADES Y VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	VARIAS	VARIOS
			SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
			ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO	01/10/2025

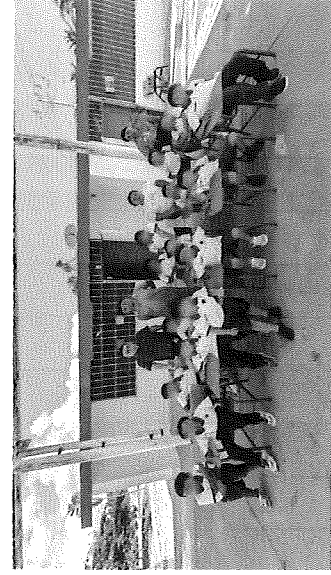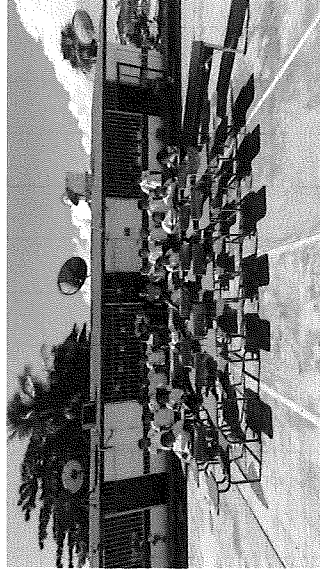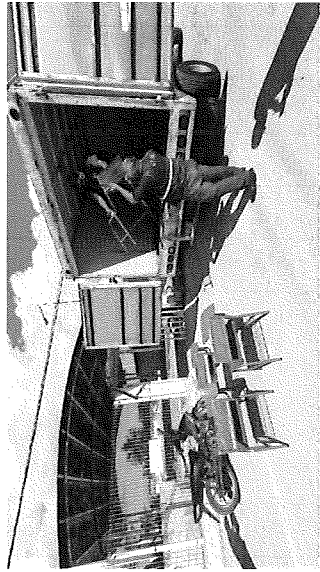



QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra

(B055) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA

Municipio:

OTHÓN P. BLANCO

Localidad:

XUL-HA

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

FAM-FAM BASICO 2025

Siendo las 11:00 horas del día 01 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. JOEL MEX HERRERA en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B055) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA representada por: C. MARÍA ANSELMA MOO CIMA en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA

Descripción breve de los trabajos OBRA: (B055) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XUL-HA DEL MUNICIPIO OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE MURO DE BLOCK CIEGO. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "D": REPARACIÓN ESTRUCTURA Y CAMBIO DE LLAVES EN LAVABOS.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

IFEQROO

ING. JOEL MEX HERRERA
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"EMILIANO ZAPATA"
CLAVE: 28090104
ZONA ESCOLAR 04
XUL-HA, QUINTANA ROO

PROFA. MARÍA ANSELMA MOO CIMA
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACION DE INDICADOR CO01ACT01




Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:		4to. Trimestre	
Programa Presupuestario:		K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:		https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:		43	
Indicador:		CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:		21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	
Indicador:		CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Denominador:		40	
Método de Cálculo:		(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:		107.50%	
Numerador:		Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.					
Denominador:		Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ					
Descripción de los resultados:		De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.					
Justificación:		Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.					

REPORTE FOTOGRAFICO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B055	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	XUL-HA	OTHÓN P. BLANCO	ING. JOEL MEX HERRERA	01/10/2025

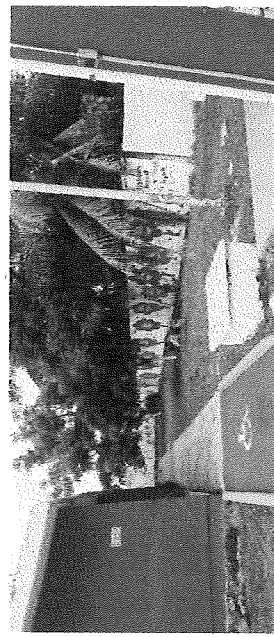






SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		212118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre: 4to. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43	
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Denominador:	40	
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.		Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%	
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B266	BÁSICO	MOBILIARIO DE REPOSICIÓN EN VARIAS LOCALIDADES Y VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	VARIAS	VARIOS	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO	03/10/2025

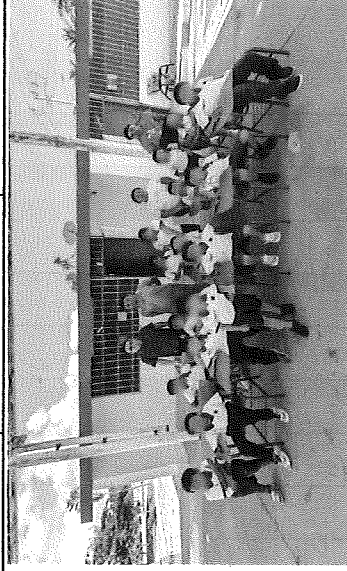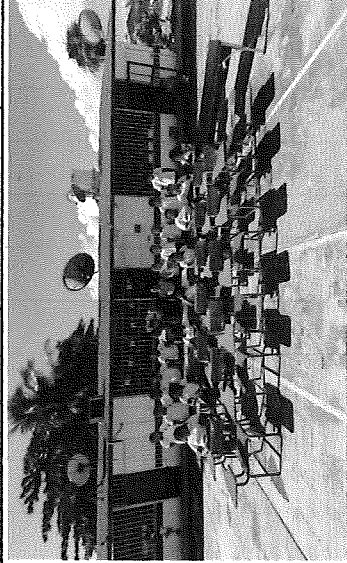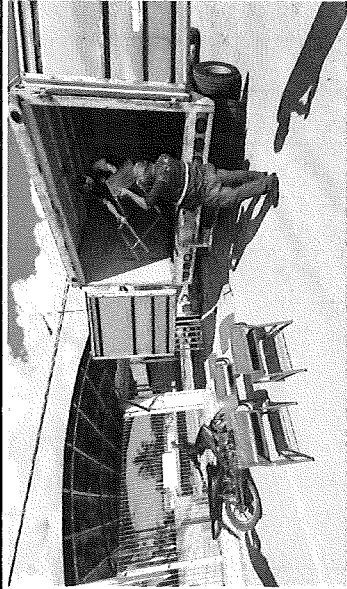



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos** y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Cédula y Nombre de la Obra	(B266) MOBILIARIO DE REPOSICIÓN EN VARIAS LOCALIDADES Y VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Municipio:	VARIOS	Localidad:	VARIAS
Origen del Recurso:	Estatul (X) Federal () Municipal () Mezcla ()	Fondo o Convenio	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2018

Siendo las 10 horas del día 3 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofía Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa de Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(B266) MOBILIARIO DE REPOSICIÓN EN VARIAS LOCALIDADES Y VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PRIMARIA PASCUAL CORAL HEREDIA, EN LA LOCALIDAD CHETUMAL, EN EL MUNICIPIO OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO con CCT 23DPR06380**, representada por Leticia López Ordoñez, en su carácter de directora.

Descripción breve de la acción: Mobiliario de 5 escritorios para maestro, en la Primaria Pascual Coral Heredia, correspondiente al contrato de LP-IFEQROO-GESCORPION-FAMBAS-ADQ-035/2018.

Beneficiados: 42 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y
mantenimiento

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa de Departamento de Bienes Adquiridos
en Tránsito y Almacén

Leticia Lopez Ordoñez

Nombre, Cargo y Firma

Sellos

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y
mantenimiento



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"PASCUAL CORAL MEREDIA"
CLAVE: 230PR06380
ZONA ESCOLAR 014
CHETUMAL, QUINTANA ROO



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: MOBILIARIO DE REPOSICIÓN EN VARIAS LOCALIDADES Y
VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
LOCALIDAD: VARIAS
MUNICIPIO: VARIOS
CEDULA: B266

PROGRAMA: FAM BÁSICO 2018


CLAVE	DESCRIPCION	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
LP-IFEQROO-GESCORPION-FAMBAS-ADQ-035/2018					
4	MESA PARA MAESTRO	PZA	5	\$2,960.40 \$	14,802.00

NOTA: SE ENTREGO EN LA CCT 23DPR06380 PRIMARIA PASCUAL
CORAL HEREDIA, LOCALIDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO

TOTAL: **\$14,802.00**

OBSERVACIONES: _____

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO CARGO: JEFA DE DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN FIRMA: <i>Ana Sofia</i> SELLO:   IFEQROO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	NOMBRE: <i>Leticia López Ordoñez</i> CARGO: <i>Directora</i> FIRMA: <i>[Signature]</i> SELLO:  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE QUINTANA ROO ESCUELA PRIMARIA "PASCUAL CORAL HEREDIA" CLAVE: 23DPR06380 ZONA ESCOLAR 0 CHETUMAL, QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Cédula y Nombre de la Obra	(B037) REHABILITACION EN LA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA		
Municipio:	OTHÓN P. BLANCO	Localidad:	CHETUMAL
Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()	Fondo o Convenio		FAM-FAM BASICO 2025

Siendo las 08:00 horas del día 09 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por C. FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B037) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA representada por: C. _____ en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: (B037) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: SE REALIZARON LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO B DEL PREPARADO DE SUPERFICIE, FINO DE CONCRETO DE 3CM DE ESPESOR PARA LA NIVELACION DE ENTREPISO, LOSETA DE CERAMICA DE 60X60CM MARCA INTERCERAMIC O EQUIVALENTE, LA DEMOLICION DE CALCRETO CON IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA, CALCRETO EN LOSA DE AZOTEA CON MORTERO, CHAFLAN DE 10X10CM A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA EN AZOTEA, APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ETC.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezará la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO


Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME
RESIDENTE DE OBRA

Prof. Carlos M. Bravos Lopez
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

SEQ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"CENTENARIO DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA" T.L.
C.C.T. 23DPR0756C
ZONA ESCOLAR: 002
CHETUMAL, Q. ROO.

Edna Isabel Cabrera Pacheco
Nailea Niamath Martinez Hajjara
Alejandra M. Lopez Dzul



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:		https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:		107.50%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO					
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR
B037	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. FELIPE ÁNGEL GRAJALES JACOME
					FECHA DE ENTREGA
					09/10/2025





IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra

CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO

TECONOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 272

Municipio: BENITO JUÁREZ

Localidad: CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA
BARDA PERIMETRAL EN EL
CENTRO DE BACHILLERATO
TECONOLÓGICO INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS NUM. 272,
UBICADO EN LA LOCALIDAD
DE CANCÚN DEL MUNICIPIO
DE BENITO JUÁREZ,
QUINTANA ROO

Siendo las 09:30 horas del día 16 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECONOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 272 representada por: C. _____ en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE REJACERO.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.


Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.


Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO


ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento


ARACELI PAOLA ROMERO LANDERO
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	4to. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	43
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
------------	---	---------------------	--	---------------	----

Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
--------------------	---	-------------------------------------	---------



Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.
------------	--

Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ
--------------	---

Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.
--------------------------------	---

Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.
----------------	---

REPORTE FOTOGRÁFICO					FECHA DE ENTREGA	
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	
S/C	MEDIA SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 272	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN	16/10/2025

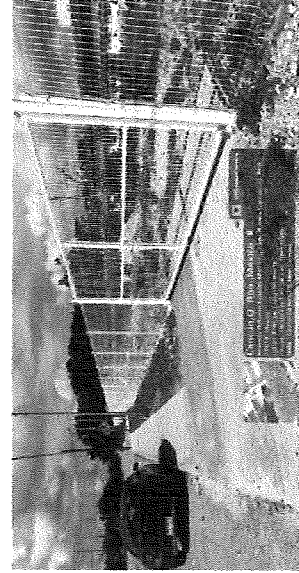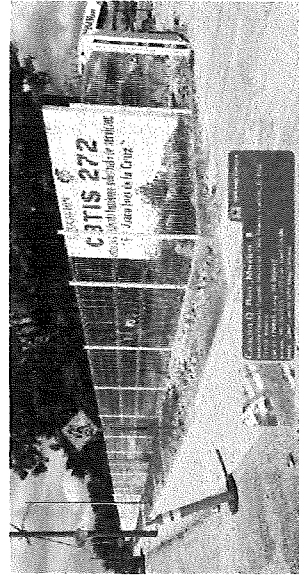



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra (B020) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA.

Municipio: BENITO JUÁREZ **Localidad:** CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla () **Fondo o Convenio** FAM- FAM BASICO 2025

Siendo las 08:30 horas del día 17 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra:(B020) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA representada por: C. _____ en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICAS DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.


Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO


ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento


Pedro García Ramírez
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL


SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
EDUARDO ENRIQUE
MÉNDEZ PALMA T.M.
C.C.T. 23DPR0137U
ZONA ESCOLAR 047
CANCÚN, QUINTANA ROO





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:		https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentran beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:		107.50%	
Numerador:		Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.			
Denominador:		Total de Planteles que se encuentran beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:		De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentran beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.			
Justificación:		Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.			

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B020	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN	17/10/2025

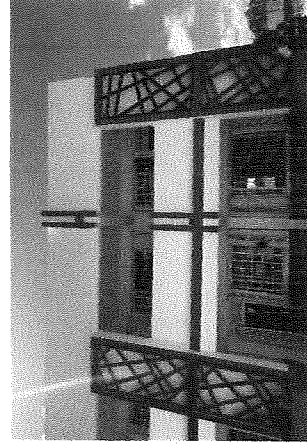



FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra (B024) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER (EDIFICIO "A").

Municipio: BENITO JUÁREZ **Localidad:** CANCUN

Origen del Recurso: Estatal (☒) Federal (☐) Municipal (☐) Mezcla (☐) **Fondo o Convenio** FAM- FAM BASICO 2025

Siendo las 08:30 horas del día 17 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B024) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER (EDIFICIO "A") representada por: C. _____ en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS EN EDIFICIO A.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

RECIBE

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"MIGUEL VIDAL ALCOCER" TM
CCT 230PRO1971
ZONA ESCOLAR 041
CANCÚN, B. J. QUINTANA ROO

DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

ALFREDO JUNA CAMARENA
PRESIDENTE





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C001ACT01




Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:		https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	C001ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentran beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles impactados:		107.50%	
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentran beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentran beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B024	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER (EDIFICIO "A")	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN	17/10/2025

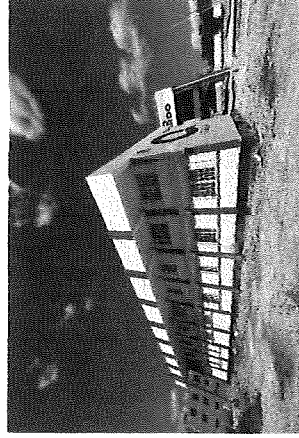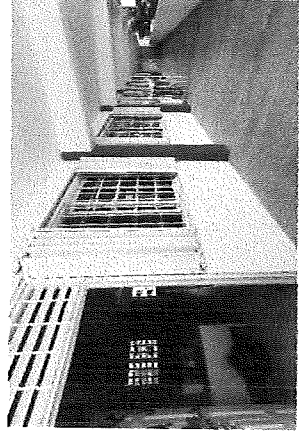



QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra (B024) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER (EDIFICIO "B").

Municipio: BENITO JUÁREZ **Localidad:** CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla () **Fondo o Convenio** FAM- FAM BASICO 2025

Siendo las 08:30 horas del día 17 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B024) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER (EDIFICIO "B") representada por: C. _____ en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS Y CUBO DE ESCALERA EN EDIFICIO B.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento


Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"MIGUEL VIDAL ALCOCER" 11
CCT 230PA01971
ZONA ESCOLAR 001
CANTÓN, S. A. QUINTANA ROO

ALFREDO LUNA CANAREÑA
PRESIDENTE




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01




IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
2022/2023

Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación: https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/		
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador:	40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, ya el resultado obtenido de 1,075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
M002	MEDIA SUPERIOR	REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 111	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN	17/10/2025





IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(M002) REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS NUM 111

Cédula y Nombre de la Obra

Municipio: BENITO JUÁREZ **Localidad:** CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

FAM- REMANENTES FAM
DEL CONVENIO DE
COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN PARA LA
POTENCIACIÓN MEDIA
SUPERIOR

Siendo las 10:30 horas del día 17 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra:(M002) REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 111 representada por: C. en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezará la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL Y DE SERVICIO No. 111
"LEONA VICARIO"
CANCÚN, Q. ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra (B041) REHABILITACION EN EL PREESCOLAR INSURGENTES

Municipio: OTHÓN P. BLANCO **Localidad:** CHETUMAL

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla () **Fondo o Convenio** FAM-FAM BASICO 2025

Siendo las 11:00 horas del día 17 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. JOEL MEX HERRERA en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B041) REHABILITACION EN EL PREESCOLAR INSURGENTES representada por: C. ROSA ELENA IBARRA GONZALEZ en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL PREESCOLAR INSURGENTES

Descripción breve de los trabajos OBRA: (B041) REHABILITACION EN EL PREESCOLAR INSURGENTES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C": PINTURA EXTERIOR EN EDIFICIOS, COLOCACIÓN DE LOSETA EN AULA Y PASILLO, CAMBIO DE LUMINARIAS Y VENTILADORES, MANTENIMIENTO A PROTECTORES, CAMBIO DE PUERTAS Y CANCELERÍA DE MADERA, COLOCACIÓN WC INFANTILES, LLAVE DE MINGITORIO, MESETA Y TARJA. + OBRA EXTERIOR: ELABORACIÓN DE RAMPAS Y MANTENIMIENTOS A LUMINARIAS PUNTA DE POSTE

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento


Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

ING. JOEL MEX HERRERA
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

SEQ
Servicios Educativos de Quintana Roo
Área de Niños Insurgentes
Clave: 330JH0049S
Chetumal, C.R.R. de Roq.

PROFA. ROSA ELENA IBARRA GONZALEZ
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		212118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:	21211.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentran beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%	
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentran beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRAFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
B041	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR INSURGENTES	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO
				SUPERVISOR
				ING. JOEL MEX HERRERA
				FECHA DE ENTREGA
				17/10/2025

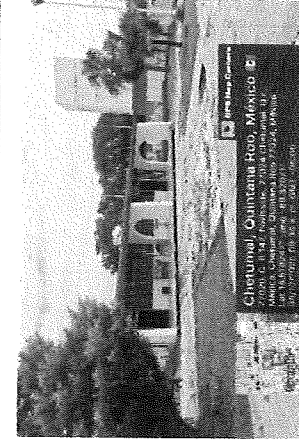



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables**, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra
Cédula y Nombre de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(B080) EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 IKAL

Municipio: BENITO JUÁREZ

Localidad: CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio: FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2025

Siendo las 12:00 horas del día 17 del mes de Octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofia Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa del Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(B080) EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 IKAL con CCT 23DST0039E**, representada por Cesar A. Díaz Castillo, en su carácter de Director.

Descripción breve de la acción: (B080) Equipamiento de mobiliario y equipo para el Taller de Cómputo, en la Secundaria Técnica No. 39 Ikal, correspondiente al contrato LP-IFEQROO-PREYCOT-FAMBAS-ADQ-007/2025.

Beneficiados: 646 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.





Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

**Entrega por la ejecutora
IFEQROO**

Ana Sofía

Ing. Ana Sofía Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Cesar A. Díaz Castillo
Director
Nombre, Cargo y Firma

Sellos

**Entrega por la ejecutora
IFEQROO**



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



Servicios Educativos de Quintana Roo
Escuela Secundaria Técnica 39 "IKAL"
Clave 23DST0039E
Cancún Quintana Roo



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39
IKAL
LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: B080

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
BÁSICO 2025

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
LP-IFEQROO-PREYCOT-FAMBAS-ADQ-007/2025						
TALLER DE CÓMPUTO						
MOB001	SILLA PARA MAESTRO, MARCA PUZA, MODELO SM001	S/N	PZA	1	\$ 1,869.92	\$ 1,869.92
MOB002	MESA PARA MAESTRO, MARCA PUZA, MODELO MM012	S/N	PZA	1	\$ 7,101.52	\$ 7,101.52
MOB010	SILLA APILABLE, MARCA PUZA, MODELO SM001	S/N	PZA	42	\$ 2,066.42	\$ 86,789.81
MOB002SK	MESA DE COMPUTO, MARCA PUZA, MODELO MC001	S/N	PZA	42	\$ 10,370.11	\$ 435,544.62
MOBBJ309	COMPUTADORA, MARCA DELL, MODELO PRO 24 ALL- IN-ONE 24"	B28TDB4, 828TDB4, D48TDB4, 8D8GXB4, H69PXB4, 7BCTDB4, 6BCTDB4, 9BCTDB4, 5BCTDB4, 118TDB4, JJ0WDB4, 1CCTDB4, D9CTDB4, 4BCTDB4, 8BCTDB4, JY4TDB4, F28TDB4, 808TDB4, 2BCTDB4, BBCTDB4, 859PXB4, 649PXB4, G49PXB4, 779PXB4, 499PXB4, 249PXB4, 8BDPXB4, 6BDPXB4, 949PXB4, 149PXB4, JC8GXB4, 9D8GXB4, BD8GXB4, 5BDPXB4, 6DWDWB4, B79PXB4, F79PXB4, G79PXB4, 879PXB4, 1DDPXB4, 549PXB4, 518TDB4, 679PXB4	EQUIPO	43	\$ 44,795.60	\$ 1,926,210.97
MOBG016	GABINETE METÁLICO, MARCA PUZA, MODELO GM090	S/N	PZA	1	\$ 8,703.48	\$ 8,703.48
MOB018A	IMPRESORA LASER, MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS PA4000WX	1AP4Y03181	PZA	1	\$ 12,026.88	\$ 12,026.88
MOBBJ122	MESA PARA IMPRESORA, MARCA PUZA, MODELO MIM60	S/N	PZA	1	\$ 3,045.00	\$ 3,045.00



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39
IKAL
LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: B080

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
BÁSICO 2025

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
MOB036	PROYECTOR, MARCA EPSON, MODELO POWERLITE W49	X8B75500172	EQUIPO	1	\$ 26,841.24	\$ 26,841.24
MOB004	CESTO METÁLICO, MARCA PUZA, MODELO CM020	S/N	PZA	2	\$ 860.72	\$ 1,721.44
MOB019A	SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB019B	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACIÓN, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB019E	SEÑAL DE EXTINTOR, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	2	\$ 371.20	\$ 742.40
MOB020D	SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	1	\$ 426.88	\$ 426.88
MOB057B	EXTINTOR B, MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	2	\$ 7,548.12	\$ 15,096.24
TOTAL					\$ 2,526,862.80	

ENTREGA

NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN

FIRMA: Ana Sofia

SELLO:



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECIBE

NOMBRE: Cesar A. Diaz Castillo


CARGO: Director

FIRMA:

SELLO:






Servicios Educativos de Quintana Roo
Escuela Secundaria Técnica 39 "IKAL"
Clave 23DST0039E
Cancún Quintana Roo



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01

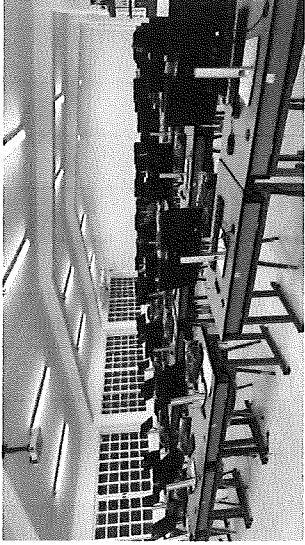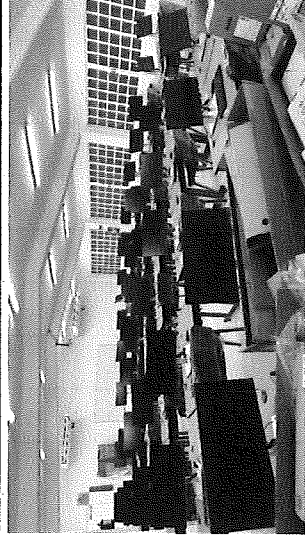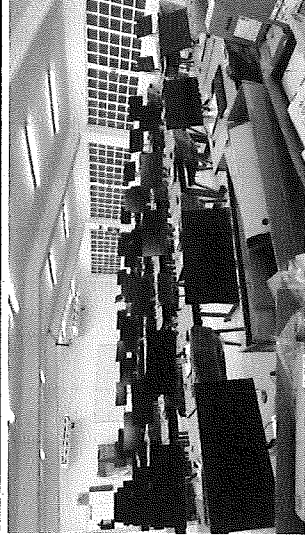

Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43	
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	
Indicador:			Denominador:	40	
Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%	
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				
REPORTE FOTOGRÁFICO					
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR
B080	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 IKAL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
					
					
			17/10/2025		



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra
Cédula y Nombre de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(B071) EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO KUSAMIL
Municipio: BENITO JUÁREZ Localidad: CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2024

Siendo las 7:00 horas del día 21 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofia Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa del Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(B071) EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO KUSAMIL** con CCT 23DST0043R, representada por Carlos Miguel Sandoval Sanchez, en su carácter de Director del plantel.

Descripción breve de la acción: **(B071) Equipamiento de 2 Aulas Didácticas, Laboratorio Multidisciplinario, Taller de Cómputo, Administración y Sanitarios, en la Secundaria de Nueva Creación, Fraccionamiento Kusamil, correspondiente al contrato IT-IFEQROO-PREYCOT-FAMBAS-ADQ-005/2024.**

Beneficiados: 80 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Carlos Miguel Sandoval Sanchez
Director

Nombre, Cargo y Firma

Sellos

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



DIRECCIÓN
Esc. Sec. 15c. No. 43
C.C.T. 230510043R
Kuxamil
Cancún, Quintana Roo



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN,
FRACCIONAMIENTO KUSAMIL
LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: B071

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO
2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	--------------	----	-------	------	-------

IT-IFEQROO-PREYCOT-FAMBAS-ADQ-005/2024

2 AULAS DIDÁCTICAS

MOB001	SILLA PARA MAESTRO, MARCA PUZA, MODELO SM001	S/N	PZA	2	\$ 1,672.72	\$ 3,345.44
MOB002	MESA PARA MAESTRO, MARCA PUZA, MODELO MM012	S/N	PZA	2	\$ 6,400.88	\$ 12,801.76
MOB003	SILLA DE PALETA, MARCA PUZA, MODELO SPD01	S/N	PZA	76	\$ 2,643.64	\$ 200,916.64
MOB003Z	SILLA DE PALETA ZURDA, MARCA PUZA, MODELO SPZ01	S/N	PZA	4	\$ 2,643.64	\$ 10,574.56
MOB004	CESTO METALICO, MARCA PUZA, MODELO CM020	S/N	PZA	2	\$ 747.04	\$ 1,494.08
MOB019A	SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	2	\$ 330.60	\$ 661.20
MOB019B	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	2	\$ 330.60	\$ 661.20
MOB019E	SEÑAL DE EXTINTOR, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	1	\$ 330.60	\$ 330.60
MOB020D	SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	1	\$ 433.84	\$ 433.84
MOB021	EXTINTOR A, MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 1,912.84	\$ 1,912.84

LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO

MOB038A	DESECADOR DE 200 MM DE DIAMETRO, MARCA ISOLAB, MODELO 200MM	S/N	PZA	1	\$ 9,585.08	\$ 9,585.08
MOB058A	PAQUETE DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL, MARCA VARIAS, MODELO VARIOS	S/N	PAQUETE	1	\$ 172,412.54	\$ 172,412.54
MOB039A	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE VIGA, MARCA VELAB, MODELO VE-2610	S/N	PZA	2	\$ 3,524.08	\$ 7,048.16
MOB040A	APARATO HOFFMAN, MARCA AESA, MODELO CV065-A	S/N	PZA	1	\$ 3,748.54	\$ 3,748.54
MOB041A	JERINGA PASCAL DE VIDRIO DE ÉMBOLO Y EMPUÑADURA, MARCA CIVEQ, MODELO 2093	S/N	PZA	2	\$ 406.58	\$ 813.16
MOB042A	MICROSCOPIO BINOCULAR 10X - 18 MM, MARCA VELAB, MODELO VE-B1	S/N	PZA	6	\$ 15,477.88	\$ 92,867.28
MOB043A	VASOS COMUNICANTES VIDRIO BASE DE MADERA, MARCA CIVEQ, MODELO 2037	S/N	PZA	2	\$ 573.04	\$ 1,146.08



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN,
FRACCIONAMIENTO KUSAMIL
LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: B071

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO
2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
MOB044A	CONJUNTO DE PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA, MARCA VARIAS, MODELO VARIOS	S/N	JUEGO	3	\$ 10,502.64	\$ 31,507.92
MOB045A	CONJUNTO DE PRÁCTICAS DE QUÍMICA, MARCA VARIAS, MODELO VARIOS	S/N	JUEGO	3	\$ 14,547.56	\$ 43,642.68
MOB046A	CONJUNTO DE PRACTICAS DE MECANICA, MARCA VARIAS, MODELO VARIOS	S/N	JUEGO	1	\$ 15,825.88	\$ 15,825.88
MOB047A	CONJUNTO DE PRACTICAS ELECTRICIDAD, MARCA VARIAS, MODELO VARIOS	S/N	JUEGO	1	\$ 14,435.04	\$ 14,435.04
MOB050A	CONJUNTO DE PRACTICAS DE TERMOLOGIA, MARCA VARIAS, MODELO VARIOS	S/N	JUEGO	1	\$ 11,127.88	\$ 11,127.88
MOB051A	CONJUNTO DE PRÁCTICAS DE ÓPTICA, MARCA VARIAS, MODELO VARIOS	S/N	JUEGO	1	\$ 7,888.58	\$ 7,888.58
MOB0441	REACTIVOS Y CRISTALERIA BIOLOGIA, MARCA VARIAS, MODELO VARIOS	S/N	JUEGO	1	\$ 34,305.26	\$ 34,305.26
MOB0451	REACTIVOS Y CRISTALERIA QUIMICA, MARCA VARIAS, MODELO VARIOS	S/N	JUEGO	1	\$ 114,730.38	\$ 114,730.38
MOB049A	VERNIER GRANDE, MARCA SIN MARCA, MODELO SIN MODELO	S/N	PZA	1	\$ 1,281.22	\$ 1,281.22
MOB048A	MOTOR DE GASOLINA (KIT), MARCA SIN MARCA, MODELO SIN MODELO	S/N	PZA	1	\$ 10,027.04	\$ 10,027.04
MOB052A	BOMBA PORTÁTIL PRESIÓN Y VACÍO PRESIÓN 5" HG, MARCA ROCKER, MODELO 3000	S/N	PZA	1	\$ 6,192.08	\$ 6,192.08
MOB053A	ESTUFA (HORNO 8 CALORES HASTA 180°), MARCA ECOSHEL, MODELO 9053L	S/N	PZA	1	\$ 9,186.62	\$ 9,186.62
MOB054A	MUEBLE DE GUARDADO BAJO, MARCA PUZA, MODELO MGB02	S/N	PZA	4	\$ 14,712.28	\$ 58,849.12
MOB055A	MUEBLE DE GUARDADO ALTO, MARCA PUZA, MODELO MGA01	S/N	PZA	2	\$ 14,712.28	\$ 29,424.56
MOB056B	BANCO PARA SENTARSE, MARCA PUZA, MODELO BP030	S/N	PZA	49	\$ 1,378.08	\$ 67,525.92
MOB004	CESTO METALICO, MARCA PUZA, MODELO CM020	S/N	PZA	4	\$ 747.04	\$ 2,988.16
MOB031	BOTIQUÍN DE EMERGENCIA, MARCA PUZA, MODELO BTE01	S/N	PZA	1	\$ 2,207.48	\$ 2,207.48
MOB021	EXTINTOR A, MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	2	\$ 1,912.84	\$ 3,825.68
MOB057B	EXTINTOR B, MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	2	\$ 6,618.38	\$ 13,236.76
MOB019A	SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	2	\$ 330.60	\$ 661.20



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN,
FRACCIONAMIENTO KUSAMIL
LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: B071

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO
2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
MOB019B	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACIÓN, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	2	\$ 330.60	\$ 661.20
MOB019C	SEÑAL DE PRIMEROS AUXILIOS, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	1	\$ 330.60	\$ 330.60
MOB019E	SEÑAL DE EXTINTOR, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	1	\$ 330.60	\$ 330.60
MOB019H	SEÑAL DE NO FUMAR, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	1	\$ 330.60	\$ 330.60
MOB020D	SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	1	\$ 433.84	\$ 433.84
TALLER DE CÓMPUTO						
MOB001	SILLA PARA MAESTRO, MARCA PUZA, MODELO SM001	S/N	PZA	1	\$ 1,672.72	\$ 1,672.72
MOB002	MESA PARA MAESTRO, MARCA PUZA, MODELO MM012	S/N	PZA	1	\$ 6,400.88	\$ 6,400.88
MOB010	SILLA APILABLE, MARCA PUZA, MODELO SM001	S/N	PZA	42	\$ 1,672.72	\$ 70,254.24
MOB002SK	MESA DE COMPUTO, MARCA PUZA, MODELO MC001	S/N	PZA	42	\$ 8,674.48	\$ 364,328.16
MOB309	COMPUTADORA, MARCA HP, MODELO PROONE 240 G10 ALL-IN- ONE	8CC4082YKC, 8CC4150V4L, 8CC4150TV7, 8CC4150TH1, 8CC4150VJF, 8CC4150TVR, 8CC4150VPC, 8CC4150V92, 8CC4150TT8, 8CC4150T7D, 8CC4150TT1, 8CC4150TTC, 8CC082YJ6, 8CC4150TSQ, 8CC4150TT9, 8CC4150TGD, 8CC4150TH6, 8CC4150T9X, 8CC4150V14, 8CC4150W27, 8CC4150VYB, 8CC4150TX4, 8CC4082YLK, 8CC4082YJG, 8CC4150VHV, , 8CC4150TTV, 8CC4150V3V, 8CC4150W3P, 8CC4150TJD, 8CC4150TRX, 8CC4150TP7, 8CC4150VLO, 8CC4150W1Z, 8CC4150T5V, 8CC4150V9N, 8CC4150TPB, 8CC4082YHQ, 8CC4150TR5, 8CC4150W3G, 8CC4150T9N, 8CC4150W01, 8CC4150TVD, 8CC4150T9B	EQUIPO	43	\$ 32,870.34	\$ 1,413,424.62
MOBG016	GABINETE METÁLICO, MARCA PUZA, MODELO GM090	S/N	PZA	5	\$ 7,317.28	\$ 36,586.40



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN,
FRACCIONAMIENTO KUSAMIL
LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: B071

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO
2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
MOB018A	IMPRESORA LASER, MARCA HP, MODELO LASER JET PRO MFP 4103FDW	CNCR53L877	PZA	1	\$ 11,525.76	\$ 11,525.76
MOB122	MESA PARA IMPRESORA, MARCA PUZA, MODELO MIM60	S/N	PZA	1	\$ 2,066.54	\$ 2,066.54
MOB036	PROYECTOR, MARCA EPSON, MODELO POWER LITE E20	V11H93B1020	EQUIPO	1	\$ 24,270.68	\$ 24,270.68
MOB004	CESTO METALICO, MARCA PUZA, MODELO CM020	S/N	PZA	2	\$ 747.04	\$ 1,494.08
MOB019A	SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	1	\$ 330.60	\$ 330.60
MOB019B	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACIÓN, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	1	\$ 330.60	\$ 330.60
MOB019E	SEÑAL DE EXTINTOR, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	2	\$ 330.60	\$ 661.20
MOB020D	SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	1	\$ 433.84	\$ 433.84
MOB057B	EXTINTOR B, MARCA EXTING-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	2	\$ 6,618.36	\$ 13,236.76
ADMINISTRACIÓN						
MOB005	ESCRITORIO SEC, MARCA PUZA, MODELO EM120	S/N	PZA	16	\$ 9,176.18	\$ 146,818.88
MOB005G	ESCRITORIO DIR, MARCA PUZA, MODELO DIR140	S/N	PZA	3	\$ 11,667.28	\$ 35,001.84
MOB006	SILLÓN EJECUTIVO, MARCA OFFIHO, MODELON ECO120	S/N	PZA	1	\$ 4,558.22	\$ 4,558.22
MOB007	SILLA SECRETARIAL, MARCA OFFIHO, MODELO OHS10	S/N	PZA	8	\$ 3,637.76	\$ 29,102.08
MOB008	CREDENZA METÁLICA, MARCA PUZA, MODELO CR150	S/N	PZA	3	\$ 12,479.28	\$ 37,437.84
MOB009	ARCHIVERO METÁLICO, MARCA PUZA, MODELO ARC04	S/N	PZA	12	\$ 9,567.10	\$ 114,805.20
MOB010	SILLA APILABLE, MARCA PUZA, MODELO SM001	S/N	PZA	40	\$ 1,672.72	\$ 66,908.80
MOB011	MESA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS, MARCA PUZA, MODELO MJ240	S/N	PZA	1	\$ 18,937.00	\$ 18,937.00
MOB004	CESTO METALICO, MARCA PUZA, MODELO CM020	S/N	PZA	12	\$ 747.04	\$ 8,964.48
MOB012	ASTA DE BANDERA 2.30 M, MARCA EL ARTILLERO, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 1,591.52	\$ 1,591.52
MOB013	BANDERA NACIONAL PARA INTERPERIE, MARCA EL ARTILLERO, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 3,632.54	\$ 3,632.54



ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN,
FRACCIONAMIENTO KUSAMIL
LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: B071

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO
2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
MOB019K	SEÑAL DE LAVARSE LAS MANOS, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	2	\$ 433.84	\$ 867.68
MOB019L	SEÑAL DE USAR GEL ANTIBACTERIAL, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	2	\$ 186.76	\$ 373.52
MOB419	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL, MARCA EXTIN- FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	2	\$ 1,545.12	\$ 3,090.24
MOB021	EXTINTOR A, MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	2	\$ 1,912.84	\$ 3,825.68
MOB031	BOTIQUÍN DE EMERGENCIA, MARCA PUZA, MODELO BTE01	S/N	PZA	1	\$ 2,207.48	\$ 2,207.48
SANITARIOS						
MOB019D1	SEÑAL DE SERVICIO SANITARIO CABALLEROS, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	1	\$ 330.60	\$ 330.60
MOB019D2	SEÑAL DE SERVICIO SANITARIO DAMAS, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	1	\$ 330.60	\$ 330.60
MOB019D3	SEÑAL DE SERVICIO SANITARIO DISCAPACITADOS, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	1	\$ 330.60	\$ 330.60
MOB019I	SEÑAL DE NO TIRAR EN WC, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	3	\$ 433.84	\$ 1,301.52
MOB019J	SEÑAL DE NO USAR ACIDO, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	3	\$ 433.84	\$ 1,301.52
MOB019K	SEÑAL DE LAVARSE LAS MANOS, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	3	\$ 433.84	\$ 1,301.52
MOB019L	SEÑAL DE USAR GEL ANTIBACTERIAL, MARCA ADCOMA&SIC, MODELO PVC ESPUMADO	S/N	PZA	3	\$ 186.76	\$ 560.28
MOB419	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL, MARCA EXTIN- FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	3	\$ 1,545.12	\$ 4,635.36
TOTAL						\$ 3,591,379.72



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN,
FRACCIONAMIENTO KUSAMIL
LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: B071

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO
2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	--------------	----	-------	------	-------

ENTREGA

NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO

CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS
EN TRÁNSITO Y ALMACÉN

FIRMA: Ana Sofia

SELLO:



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECIBE

NOMBRE: Carlos Miguel Sandaval Sánchez


CARGO: Director

FIRMA:

SELLO:






DIRECCIÓN
Esc. Sec. Téc. No. 43
C.C.T. 23DST004SR
Kusamil
Cancún, Quintana Roo



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01

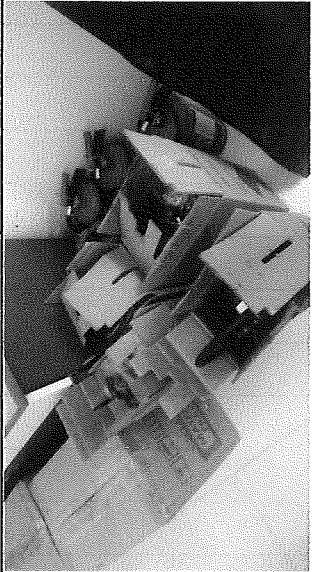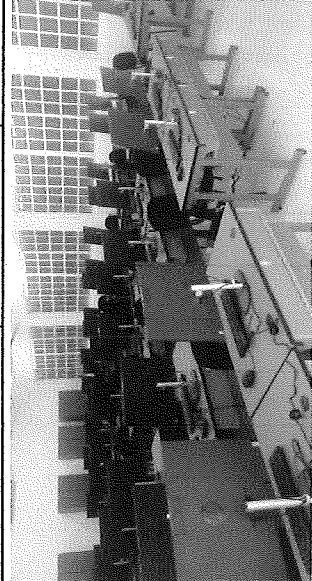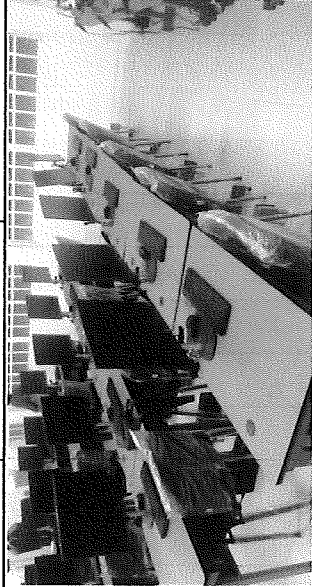

Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43	
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Denominador:	40	
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%	
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				
REPORTE FOTOGRÁFICO					
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR
B071	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO KUSAMIL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
					
					
			21/10/2025		



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega- Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra
Cédula y Nombre de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(B073) EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA

Municipio: BENITO JUÁREZ

Localidad: CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio: FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2025

Siendo las 9:30 horas del día 21 del mes de Octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofia Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa del Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(B073) EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA con CCT 23DPR0137U**, representada por Pedro Garcia Ramirez, en su carácter de Director.

Descripción breve de la acción: (B073) Equipamiento de mobiliario para 1 Aula Didáctica, en la Primaria Eduardo Enrique Méndez Palma, correspondiente al contrato AD-IFEQROO-ARCO10-FAMBAS-ADQ-008/2025.

Beneficiados: 35 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

**Entrega por la ejecutora
IFEQROO**

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Pedro Garcia Ramirez
Pedro Garcia Ramirez
Nombre, Cargo y Firma

Sellos

**Entrega por la ejecutora
IFEQROO**



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
EDUARDO ENRIQUE
MÉNDEZ PALMA T.M.
C.C.T. 23DPR0137U
ZONA ESCOLAR 347
CANCÚN, QUINTANA ROO



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA EDUARDO
ENRIQUE MÉNDEZ PALMA
LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: B073

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
BASICO 2025

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	-----------------	----	-------	------	-------

AD-IFEQROO-ARCO10-FAMBAS-ADQ-008/2025


1 AULA DIDACTICA

MOBBJ001	SILLA PARA MAESTRO, MARCA MAAS MUEBLES, MODELO MV-12	S/N	PIEZA	1	\$1,867.60	\$ 1,867.60
MOBBJ002	MESA PARA MAESTRO, MARCA OFIGRUP, MODELO JMM-ESM	S/N	PIEZA	1	\$7,076.00	\$ 7,076.00
MOBBJ003	SILLA DE PALETA, MARCA DIDACTICOS CARACOL, MODELO 694-PE04	S/N	PIEZA	33	\$2,673.80	\$ 88,235.40
MOBBJ003Z	SILLA DE PALETA ZURDA, MARCA DIDACTICOS CARACOL, MODELO 694-PE05	S/N	PIEZA	2	\$2,673.80	\$ 5,347.60
MOBBJ004	CESTO METALICO, MARCA MEMOSA, MODELO E06B16	S/N	PIEZA	1	\$858.40	\$ 858.40
MOB019A	SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA ULINE, MODELO S-21170P	S/N	PIEZA	1	\$371.20	\$ 371.20
MOB019B	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION, MARCA ULINE, MODELO S-21168R	S/N	PIEZA	1	\$423.40	\$ 423.40
MOB019E	SEÑAL DE EXTINTOR, MARCA ULINE, MODELO S-21166V	S/N	PIEZA	1	\$371.20	\$ 371.20
MOB020D	SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO, MARCA ULINE, MODELO S-21199E	S/N	PIEZA	1	\$423.40	\$ 423.40
MOBBJ021	EXTINTOR A, MARCA ULINE, MODELO S-9873	S/N	PIEZA	1	\$1,745.80	\$ 1,745.80

TOTAL \$ 106,720.00

ENTREGA

NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES
ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN
FIRMA: Ana Sofia
SELLO:



IFEQROO


INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECIBE

NOMBRE: Pedro Garcia Ramirez
CARGO: Director
FIRMA: [Firma]
SELLO:



SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
EDUARDO ENRIQUE
MÉNDEZ PALMA T.M.
C.C.T. 23DPR0137U
ZONA ESCOLAR 547
CANCÚN, QUINTANA ROO




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C001ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:		https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	C001ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
B073	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ
				SUPERVISOR
				ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
				FECHA DE ENTREGA
				21/10/2025

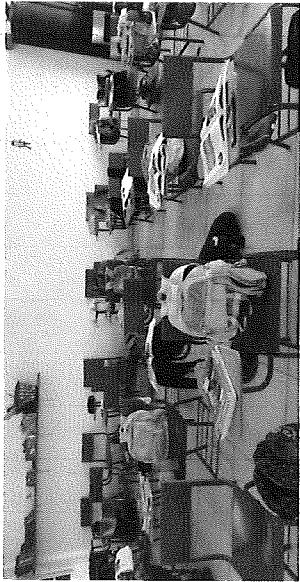



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra (B033) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR MOCTEZUMA

Municipio: OTHÓN P. BLANCO

Localidad: JOSE NARCISO ROVIROSA

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio FAM- FAM BASICO 2025

Siendo las 10:00 horas del día 21 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B033) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR MOCTEZUMA representada por: C. Nayely Romany Rodriguez en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: (B033) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR MOCTEZUMA EN LA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOSE NARCISO ROVIROSA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E": 1 DIRECCIÓN AISLADA (APOYO TÉCNICO, ZONA DE MAESTROS, DIRECCIÓN, SANITARIOS) + ANDADORES + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA + OBRA EXTERIOR HIDROSANITARIA.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento




ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA



DIRECTOR(A) DEL PLANTEL



SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
JARDIN DE NIÑOS
MOCTEZUMA
CLAVE 23DJN01051
ROVIROSA, Q. ROO






SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador: 40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentran beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:		107.50%
Numerador: Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.					
Denominador: Total de Planteles que se encuentran beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ					
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentran beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
GEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B033	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA	JOSÉ NARCISO ROVIROSA	OTHÓN P. BLANCO	ING. RICARDO ALEJANDRO CEN CEN	21/10/2025

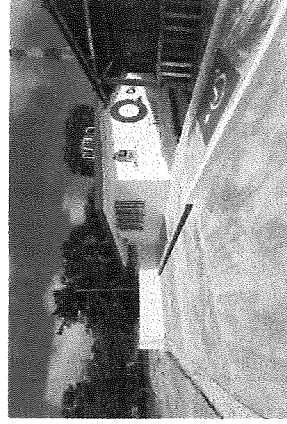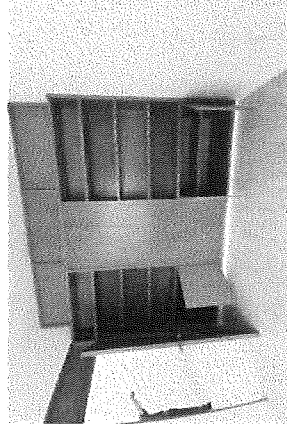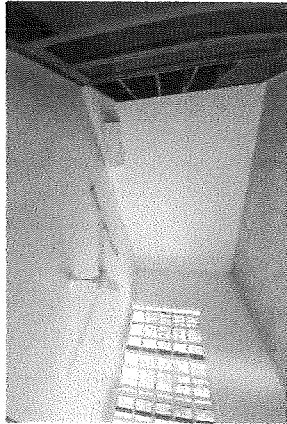



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra
Cédula y Nombre de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(B074) EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ

Municipio: BENITO JUÁREZ

Localidad: CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2025

Siendo las 10:30 horas del día 21 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofia Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa del Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(B074) EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ con CCT 23DPR0196J**, representada por LUIS HUMBERTO CANTO NOVELO, en su carácter de DIRECTOR.

Descripción breve de la acción: **(B074) Equipamiento de mobiliario para 2 Aulas Didácticas, en la Primaria Ermilo Abreu Gómez, correspondiente al contrato AD-IFEQROO-ARCO10-FAMBAS-ADQ-008/2025.**

Beneficiados: 70 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.





Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

LUIS HUMBERTO NOVELO CANTO

DIRECTOR
Nombre, Cargo y Firma

Sellos

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS DE
QUINTANA ROO
ESC. PRIM. URB. T.M.
ERMILO ABREU GÓMEZ
C.C T:23DPR0196J
ZONA ESCOLAR 047
CANCÚN, QUINTANA ROO.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA
ERMILO ABREU GÓMEZ
LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: B074

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MULTIPLES NIVEL
BASICO 2025


CLAVE	DESCRIPCION	Nº. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	--------------	----	-------	------	-------

AD-IFEQROO-ARCO10-FAMBAS-ADQ-008/2025

2 AULAS DIDACTICAS

MOBBJ001	SILLA PARA MAESTRO, MARCA MAAS MUEBLES, MODELO MV-12	S/N	PIEZA	2	\$1,867.60	\$ 3,735.20
MOBBJ002	MESA PARA MAESTRO, MARCA OFIGRUP, MODELO JMM-ESM	S/N	PIEZA	2	\$7,076.00	\$ 14,152.00
MOBBJ003	SILLA DE PALETA, MARCA DIDACTICOS CARACOL, MODELO 694-PE04	S/N	PIEZA	66	\$2,673.80	\$ 176,470.80
MOBBJ003Z	SILLA DE PALETA ZURDA, MARCA DIDACTICOS CARACOL, MODELO 694-PE05	S/N	PIEZA	4	\$2,673.80	\$ 10,695.20
MOBBJ004	CESTO METALICO, MARCA MEMOSA, MODELO E06B16	S/N	PIEZA	2	\$858.40	\$ 1,716.80
MOB019A	SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA ULINE, MODELO S-21170P	S/N	PIEZA	2	\$371.20	\$ 742.40
MOB019B	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION, MARCA ULINE, MODELO S-21168R	S/N	PIEZA	2	\$423.40	\$ 846.80
MOB019E	SEÑAL DE EXTINTOR, MARCA ULINE, MODELO S-21166V	S/N	PIEZA	2	\$371.20	\$ 742.40
MOB020D	SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO, MARCA ULINE, MODELO S-21199E	S/N	PIEZA	2	\$423.40	\$ 846.80
MOBBJ021	EXTINTOR A, MARCA ULINE, MODELO S-9873	S/N	PIEZA	2	\$1,745.80	\$ 3,491.60
TOTAL					\$	213,440.00

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	NOMBRE: LUIS HUBERTO LANTO NOVELA
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN	CARGO: DIRECTOR
FIRMA: Ana Sofia	FIRMA:
SELLO:	SELLO:
	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO ESC. PRIM. URB. T.M. ERMILO ABREU GÓMEZ C.C T:23DPR0196J ZONA ESCOLAR 047 CANCÚN, QUINTANA ROO






SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador:	40
Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%	
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
8074	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ
				ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
				21/10/2025

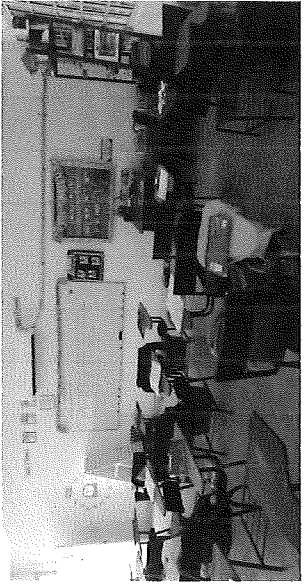



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra

(B035) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA

Municipio:

OTHÓN P. BLANCO

Localidad:

PEDRO JOAQUIN COLDWELL

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

FAM- FAM BASICO 2025

Siendo las 11:30 horas del día 21 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B035) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA representada por: C. B. Imelda Pérez Méndez en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: (B035) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUIN COLDWELL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA NIÑOS Y NIÑAS, CON BIODIGESTOR Y ANDADOR MÁS OBRA EXTERIOR ELECTRICA.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

**Entrega por la Ejecutora
IFEQROO**

ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB
RESIDENTE DE OBRA


Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento



SEQ
SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

B. Imelda Pérez Méndez
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

JARDÍN DE NIÑOS
"JUAN DE DIOS PEZA"
147K
NUEVO PUCTÉ, Q. ROO






SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:		https://ifeoroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador:	40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
B035	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA	PEDRO JOAQUÍN COLDWELL	OTHÓN P. BLANCO
				ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB
				21/10/2025

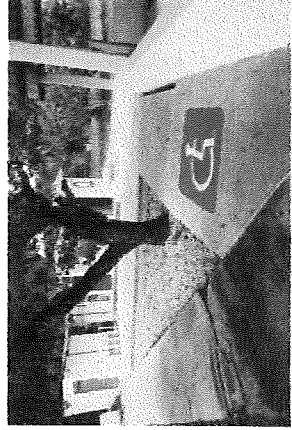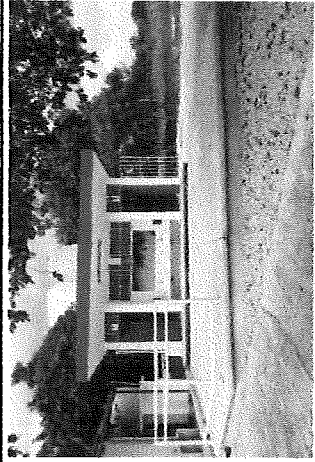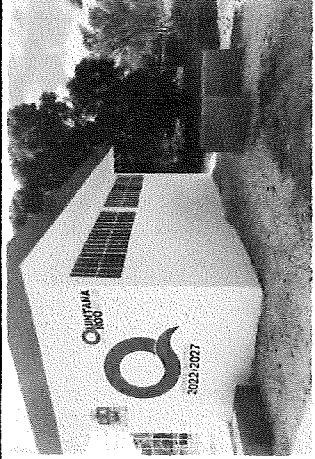



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra
Cédula y Nombre de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(B075) EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER

Municipio: BENITO JUÁREZ

Localidad: CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio: FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2025

Siendo las 12:00 horas del día 26 del mes de octubre del año 2025, los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofia Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa del Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(B075) EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER con CCT 23DPR01971**, representada por Gabriel Colli Perez, en su carácter de Director.

Descripción breve de la acción: **(B075) Equipamiento de mobiliario para 3 Aulas Didácticas, en la Primaria Miguel Vidal Alcocer, correspondiente al contrato AD-IFEQROO-ARCO10-FAMBAS-ADQ-008/2025.**

Beneficiados: 105 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

**Entrega por la ejecutora
IFEQROO**

Ana Sofia


Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Gaddiel Colli Perez
Director
Nombre, Cargo y Firma

Sellos

**Entrega por la ejecutora
IFEQROO**



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"MIGUEL VIDAL ALCOCER" TM
CCT 23DPR01971
ZONA ESCOLAR 041
CANCÚN, B. J. QUINTANA ROO





IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA
MIGUEL VIDAL ALCOCER
LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: B075

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
BÁSICO 2025

CLAVE	DESCRIPCION	Nº. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	-----------------	----	-------	------	-------

AD-IFEQROO-ARCO10-FAMBAS-ADQ-008/2025

3 AULAS DIDÁCTICAS

MOBBJ001	SILLA PARA MAESTRO, MARCA MAAS MUEBLES, MODELO MV-12	S/N	PIEZA	3	\$1,867.60	\$ 5,602.80
MOBBJ002	MESA PARA MAESTRO, MARCA OFIGRUP, MODELO JMM-ESM	S/N	PIEZA	3	\$7,076.00	\$ 21,228.00
MOBBJ003	SILLA DE PALETA, MARCA DIDÁCTICOS CARACOL, MODELO 694-PE04	S/N	PIEZA	99	\$2,673.80	\$ 264,706.20
MOBBJ003Z	SILLA DE PALETA ZURDA, MARCA DIDÁCTICOS CARACOL, MODELO 694-PE05	S/N	PIEZA	6	\$2,673.80	\$ 16,042.80
MOBBJ004	CESTO METÁLICO, MARCA MEMOSA, MODELO E06B16	S/N	PIEZA	3	\$858.40	\$ 2,575.20
MOB019A	SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA ULINE, MODELO S-21170P	S/N	PIEZA	2	\$371.20	\$ 742.40
MOB019B	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACIÓN, MARCA ULINE, MODELO S-21168R	S/N	PIEZA	3	\$423.40	\$ 1,270.20
MOB019E	SEÑAL DE EXTINTOR, MARCA ULINE, MODELO S-21166V	S/N	PIEZA	2	\$371.20	\$ 742.40
MOB020D	SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO, MARCA ULINE, MODELO S-21199E	S/N	PIEZA	2	\$423.40	\$ 846.80
MOBBJ021	EXTINTOR A, MARCA ULINE, MODELO S-9873	S/N	PIEZA	2	\$1,745.80	\$ 3,491.60

TOTAL \$ 317,248.40


ENTREGA

NOMBRE: ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO

CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES
ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN

FIRMA: Ana Sofia

SELLO:



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECIBE


NOMBRE: Gaddiel Colli Perez

CARGO: Director

FIRMA:

SELLO:


SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"MIGUEL VIDAL ALCOCER" IM
CCT 23DPR01971
ZONA ESCOLAR 041
CANCÚN, B. J. QUINTANA ROO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/		
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43	
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 40	
Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:		107.50%	
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.					
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ					
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.					
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.					
REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B075	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	21/10/2025

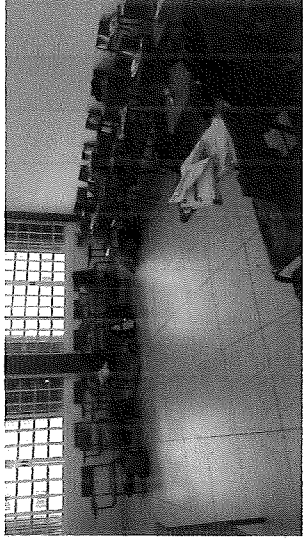



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra
Cédula y Nombre de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

(B076) EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR CENTENO (TURNO VESPERTINO)

Municipio: BENITO JUÁREZ

Localidad: CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio: FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2025

Siendo las 14:10 horas del día 21 del mes de Octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofia Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa del Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(B076) EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR CENTENO (TURNO VESPERTINO)** con CCT 23DPR0157H, representada por Dr. William Ruben Salazar Góngora, en su carácter de Director.

Descripción breve de la acción: (B076) Equipamiento de mobiliario y equipo para la Dirección, en la Primaria Gualberto Salazar Centeno (Turno Vespertino), correspondiente al contrato AD-IFEQROO-ARCO10-FAMBAS-ADQ-008/2025.

Beneficiados: 289 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.





Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Dr. William Ruben Salazar Góngora
Director
Nombre, Cargo y Firma

Sellos

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SEQ

Servicios Educativos de Quintana Roo
Escuela Primaria
"Gualberto Salazar Centeno"
Turno Vespertino
C.C.T. 23DPR0157H
Zona Escolar 064
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA GUALBERTO
SALAZAR CENTENO (TURNO VESPERTINO)
LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: B076

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
BÁSICO 2025

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
AD-IFEQROO-ARCO10-FAMBAS-ADQ-008/2025						
DIRECCIÓN						
MOBBJ01	ESCRITORIO SEC, MARCA MODELO ULINE, MODELO H-7829	S/N	PZA	2	\$ 9,338.00	\$ 18,676.00
MOBBJ006	SILLÓN EJECUTIVO, MARCA 4TUNE, MODELO 24504	S/N	PZA	1	\$ 5,249.00	\$ 5,249.00
MOBBJ005G	ESCRITORIO DIR, MARCA ULINE, MODELO H-11146	S/N	PZA	1	\$ 11,704.40	\$ 11,704.40
MOBBJ007	SILLA SECRETARIAL, MARCA JM, MODELO 107	S/N	PZA	2	\$ 3,671.40	\$ 7,342.80
MOBBJG016	GABINETE METÁLICO, MARCA ULINE, MODELO H-6318GR	S/N	PZA	2	\$ 8,700.00	\$ 17,400.00
MOBBJ009	ARCHIVERO METÁLICO, MARCA ULINE, MODELO H-1915T	S/N	PZA	2	\$ 10,097.80	\$ 20,195.60
MOBBJ010	SILLA APILABLE, MARCA ERGO, MODELO 1620N	S/N	PZA	15	\$ 2,064.80	\$ 30,972.00
MOBBJ310	MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS, MARCA ITALIA, MODELO MOD. 118	S/N	PZA	1	\$ 12,296.00	\$ 12,296.00
MOBBJ004	CESTO METÁLICO, MARCA, MARCA MEMOSA, MODELO E06B16	S/N	PZA	2	\$ 858.40	\$ 1,716.80
MOBBJ012	ASTA DE BANDERA 2.30 M, MARCA DM, MODELO 230.0000	S/N	PZA	1	\$ 1,745.80	\$ 1,745.80
MOBBJ013	BANDERA NACIONAL PARA INTERPERIE, MARCA G128, MODELO FG-1MX7E3DS-1P	S/N	PZA	1	\$ 3,799.00	\$ 3,799.00
MOBBJ014	BANDERA NACIONAL PARA INTERIORES, MARCA MARBUC, MODELO 55121700	S/N	PZA	1	\$ 1,345.60	\$ 1,345.60
MOBBJ015	PORTABANDERA, MARCA MARBUC, MODELO 10073	S/N	PZA	1	\$ 962.80	\$ 962.80
MOBBJ016	MOÑO PARA BANDERA, MARCA MB, MODELO MÑ2020	S/N	PZA	1	\$ 382.80	\$ 382.80
MOBBJ309	COMPUTADORA, MARCA HP, MODELO ALL IN ONE ENVY MOVE	3WJ1DB4	EQUIPO	1	\$ 44,793.40	\$ 44,793.40
MOBBJ018	IMPRESORA TINTA, MARCA EPSON, MODELO ECOTANK COLOR L6270	X8G5187859	PZA	1	\$ 10,034.00	\$ 10,034.00



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA GUALBERTO
SALAZAR CENTENO (TURNO VESPERTINO)
LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: B076

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
BÁSICO 2025

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
MOBBJ122	MESA PARA IMPRESORA, MARCA NMGMJQ, MODELO B0DB6WR8V	S/N	PZA	1	\$ 3,045.00	\$ 3,045.00
MOB019A	SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA ULINE, MODELO S-21170P	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB019B	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACIÓN, MARCA ULINE, MODELO S-21168R	S/N	PZA	1	\$ 423.40	\$ 423.40
MOB019C	SEÑAL DE PRIMEROS AUXILIOS, MARCA ULINE, MODELO S-24743	S/N	PZA	1	\$ 417.60	\$ 417.60
MOB019E	SEÑAL DE EXTINTOR, MARCA ULINE, MODELO S-21166V	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB019H	SEÑAL DE NO FUMAR, MARCA ULINE, MODELO S-21167P	S/N	PZA	1	\$ 417.60	\$ 417.60
MOB020D	SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO, MARCA ULINE, MODELO S21199E	S/N	PZA	1	\$ 423.40	\$ 423.40
MOB019I	SEÑAL DE NO TIRAR EN WC, MARCA ULINE, MODELO S-22445R	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB019D1	SEÑAL DE SERVICIO SANITARIO CABALLEROS, MARCA ULINE, MODELO S-10506	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB019D2	SEÑAL DE SERVICIO SANITARIO DAMAS, MARCA ULINE, MODELOS-10507	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB019J	SEÑAL DE NO USAR ACIDO, MARCA HQLCJZQ, MODELO 55121704	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB019K	SEÑAL DE LAVARSE LAS MANOS, MARCA ULINE, MODELO S-23800	S/N	PZA	2	\$ 371.20	\$ 742.40
MOB019L	SEÑAL DE USAR GEL ANTIBACTERIAL, MARCA HY-KO, MODELO 24913	S/N	PZA	2	\$ 371.20	\$ 742.40
MOBBJ420	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL, MARCA SWIPE, MODELO S012	S/N	PZA	2	\$ 1,409.40	\$ 2,818.80
MOBBJ021	EXTINTOR A, MARCA ULINE, MODELO S-9873	S/N	PZA	1	\$ 1,745.80	\$ 1,745.80
MOBBJ031	BOTIQUÍN DE EMERGENCIA, MARCA ULINE, MODELO H-5952	S/N	PZA	1	\$ 1,960.40	\$ 1,960.40

TOTAL \$ 203,580.00



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA GUALBERTO
SALAZAR CENTENO (TURNO VESPERTINO)
LOCALIDAD: CANCÚN
MUNICIPIO: BENITO JUÁREZ
CEDULA: B076

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
BÁSICO 2025

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	-----------------	----	-------	------	-------


ENTREGA

NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO

CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES
ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN

FIRMA: Ana Sofia

SELLO:



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECIBE

NOMBRE: Dr. William Ruben Salazar Góngora


CARGO: Director

FIRMA:

SELLO:



Servicios Educativos de Quintana Roo
Escuela Primaria
"Gualberto Salazar Centeno"
Turno Vespertino
C.C.T. 23DPR0157H
Zona Escolar 064
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%	
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
B076	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR CENTENO (TURNO VESPERTINO)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ
				ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
				21/10/2025





ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables**, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Cédula y Nombre de la Obra	(S008) ADQUISICIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM		
Municipio:	TULUM	Localidad:	TULUM
Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()	Fondo o Convenio FAM-REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN SUPERIOR 2022		

Siendo las 10:00 horas del día 22 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofia Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa del Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(S008) ADQUISICIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM con CCT 23EUT0004C**, representada por el Lino Jose Gomez Salazar, en su carácter de Encargado de la Dir de Bancodop

Descripción breve de la acción: (S008) Adquisición de Sistema de Paneles Solares en Azotea, en la Universidad Tecnológica de Tulum, correspondiente al contrato LP-IFEQROO-AXA-FAMSUPREM-ADQ-016/2023.

Beneficiados: 108 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y
mantenimiento

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes Adquiridos
en Tránsito y Almacén

Lim José Carlos Sabzar
Encargado de la Dir. de Planeación
Nombre, Cargo y Firma

Sellos

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y
mantenimiento



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO




DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeoroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador:	40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
S008	SUPERIOR	ADQUISICIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM	TULUM	TULUM
				ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
				22/10/2025

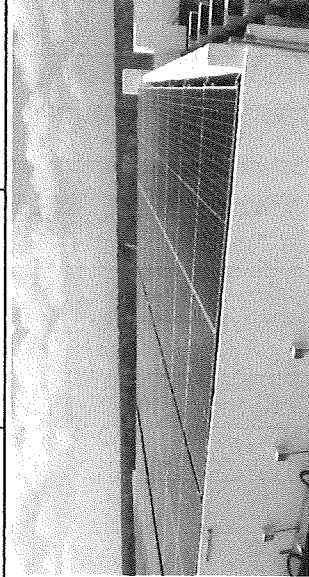



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables**, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra
Cédula y Nombre de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

(S025) ADQUISICIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM

Municipio: TULUM

Localidad: TULUM

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio: FAM- REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN SUPERIOR 2024

Siendo las 10:00 horas del día 22 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofia Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa del Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(S025) ADQUISICIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM con CCT 23EUT0004C**, representada por Ling José Gomez Salazar, en su carácter de Encargado de la Dir. de Planeación

Descripción breve de la acción: (S025) Adquisición de Unidades de Aires Acondicionados de 36,000 BTU, correspondiente al contrato IT-IFEQROO-DAVIDCASTILLO-FAMSUPREM-ADQ-029/2024.

Beneficiados: 108 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

IFEQROO

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Lino Jose Gomez Salazar
Encargado de la Dir. de Planeación
Nombre, Cargo y Firma

Sellos

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

UT BIS
UNIVERSITIES
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: ADQUISICIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM
LOCALIDAD: TULUM
MUNICIPIO: TULUM
CEDULA: S025

PROGRAMA: FAM- REMANENTES FAM
DEL CONVENIO DE
COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN PARA LA
POTENCIACIÓN
SUPERIOR 2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	--------------	----	-------	------	-------

IT-IFEQROO-DAVIDCASTILLO-FAMSUPREM-ADQ-029/2024

UNIDAD DE AIRES ACONDICIONADOS DE 36,000 BTU

AIR36	AIRE ACONDICIONADO 36000, MARCA TRANE, MODELO 4MXW2336BF000AA/4TXK2336B F00AA	X2339TO3620H0188, X2339TO3620H0054, X2409TO3620H0024, X2339TO3620H0198, X2339TO3620H0200, X2409TO3620H0166, X2339TO3620H0103	PIEZA	7	\$ 57,188.00	\$ 400,316.00
AIR37	COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 36000, MARCA S/M, MODELO S/M	S/N	PIEZA	7	\$ 8,352.00	\$ 58,464.00

TOTAL \$ 458,780.00

ENTREGA

NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO

CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES
ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN

FIRMA: Ana Sofia

SELLO:



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECIBE


NOMBRE: Lino José Gómez Salazar

CARGO: Encargado de la Dir. de
Planeación

FIRMA:

SELLO:





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C001ACT01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	4to. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	43
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
------------	---	---------------------	--	---------------	----

Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
--------------------	---	-------------------------------------	---------


Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.
------------	--

Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ
--------------	---

Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.
--------------------------------	---

Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.
----------------	---

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
S025	SUPERIOR	ADQUISICIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM	TULUM	TULUM	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	22/10/2025

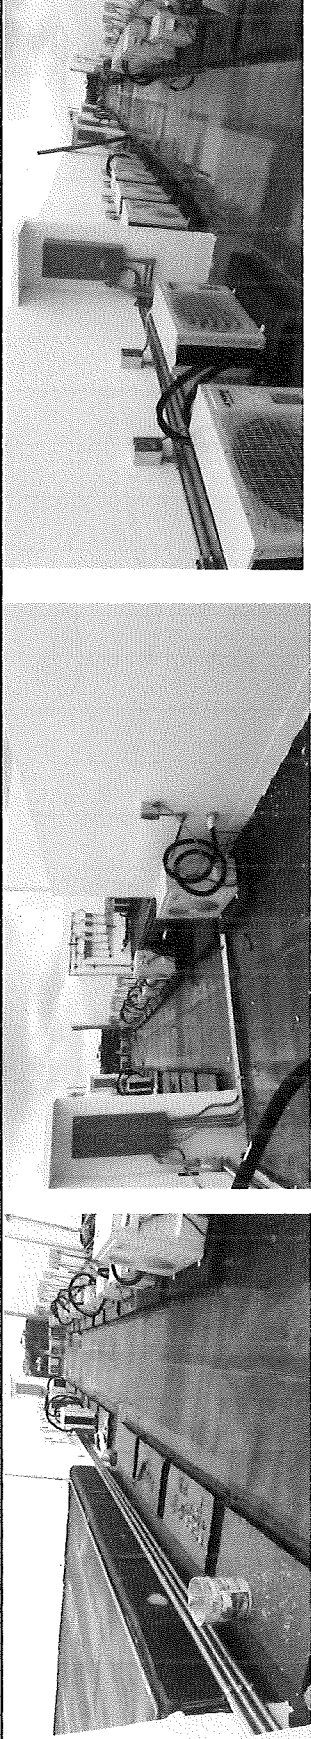



FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra

(B019) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ

Municipio:

BENITO JUÁREZ

Localidad:

CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

FAM- FAM BASICO 2025

Siendo las 10:00 horas del día 28 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B019) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ representada por: C. Luis Humberto Canto Navele en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: (B019) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO:
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS PLANTA ALTA, CUBO DE ESCALERA Y OBRA EXTERIOR

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

IFEQROO

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

SEQ

ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA
RESIDENTE DE OBRA

Luis Humberto Canto Navele
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

SERVICIOS EDUCATIVOS DE
QUINTANA ROO
ESC. PRIM. URB. T.M.
ERMILO ABREU GÓMEZ
C.C T: 230PR0196J
ZONA ESCOLAR 047
CANCÚN, QUINTANA ROO.

Reynaldo Miguel Sebastian
Director de Planeación
SER, Zona Norte




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:		107.50%
Numerador:		Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.			
Denominador:		Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B019	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA	28/10/2025

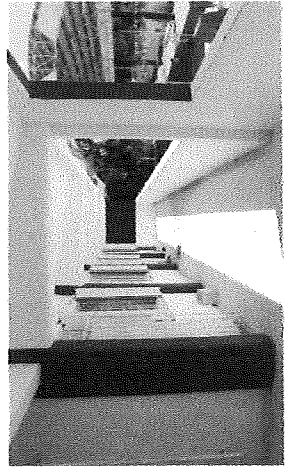



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(250275) REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN, AULAS Y SANITARIOS
EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL
MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra

Municipio: OTHÓN P. BLANCO **Localidad:** CHETUMAL

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL PARA
ENTIDADES (FISE) 2025

Siendo las 08:00 horas del día 29 del mes de octubre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (250275) REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN, AULAS Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ representada por: C. JULIAN JAVIER GOSMAN AGUIAR en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: (250275) REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN, AULAS Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: REHABILITACIÓN EDIFICIO ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN, AULAS Y SANITARIOS + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + OBRA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA+ IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.


Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB
RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR(A) DEL PLANTEL




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/		
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	43		
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%	
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRAFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
250275	BÁSICO	REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN, AULAS Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO
				ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB
				29/10/2025

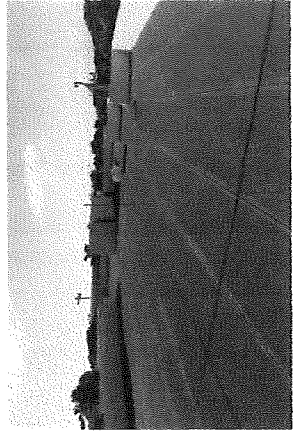



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Cédula y Nombre de la Obra (B025) CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE

Municipio: BENITO JUÁREZ **Localidad:** CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla () **Fondo o Convenio** FAM- FAM BASICO 2025

Siendo las 12:00 horas del día 04 del mes de noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B025) CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE representada por: C. Lucio Cesar Tah Palma en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: (B025) CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

**Entrega por la Ejecutora
IFEQROO**


Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

Ing. Carlos Eduardo Casar Sandria
ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA
RESIDENTE DE OBRA

Lucio Cesar Tah Palma
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Reynaldo Miguel Sebastian
Director de Planeación
SEQ, Zona Norte

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESC. SEC. GRAL. JOSE MARIA BARRERA
CLAVE: 23DES0012F
Fracc. Saché, Cancun, Quintana Roo




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES


MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:		https://ifeoroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
Numerador:					
Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.					
Denominador:					
Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ					
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B025	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA	04/11/2025





QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra

(B054) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA KOHUNLICH (DOMO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Municipio: OTHÓN P. BLANCO

Localidad: CHETUMAL

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio FAM- FAM BASICO 2025

Siendo las 11:30 horas del día 10 del mes de noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B054) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA KOHUNLICH (DOMO) representada por: C. Gabriela Guadalupe Tan Xia en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: (B054) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA KOHUNLICH (DOMO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: REHABILITACIÓN DE DOMO.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"KOHUNLICH" T.M.
ZONA ESCOLAR 017
CHETUMAL, Q.ROO
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:		107.50%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
B054	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA KOHUNLICH (DOMO)	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO
				ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB
				10/11/2025





IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Cédula y Nombre de la Obra	(B036) REHABILITACION EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGON		
Municipio:	OTHÓN P. BLANCO	Localidad:	CHETUMAL

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()	Fondo o Convenio	FAM-FAM BASICO 2025
---	-------------------------	---------------------

Siendo las 08:00 horas del día 12 del mes de noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por C. FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B036) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGON representada por: C. Nelly Margarita Lugo Pina en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: (B036) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGON, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: SE REALIZARON LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO A Y EDIFICIO B DEL RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, PREPARADO DE SUPERFICIE PARA RECIBIR AFINE, AFINE EN LOSA DE AZOTEA ACABADO FINO CON MORTERO, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, DEMOLICION DE LAMBRIN DE LOSETA, CARGA Y ACARREO EN CAMION CON CARGA MECANICA 1ER KM, ACARREO DE MATERIAL KMS SUBSECUENTES, COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 60X60CM, REPARACION DE TRABES O COLUMNA O PLAFON DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA PARA BARANDAL CON VARILLA CUADRADA DE 1/2", REHABILITACION DE PROTECCION METALICA PARA BARANDAL, RETIRO DE PINTURA VINILICA O ESMALTE, PINTURA VINILICA ACRILICA CALIDAD A, DESMANTELAMIENTO Y REINSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE CON GABINETE, SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LEDS DE 2X39W, FIRME DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, REHABILITACION DE LAMINA METALICA PARA ACCESO A AZOTEA, DESMANTELAMIENTO Y COLOCACION DE FALDON DE 2.03MTS DE ALTURA, CALCRETO EN LOSA DE AZOTEA CON MORTERO, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO, DEMOLICION DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO X20X40CM APLANADOS EN MUROS, ETC.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME
RESIDENTE DE OBRA

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGON"
C.C.T. 23DPR0221S ZONA ESCOLAR 001
CHETUMAL, Q. ROO


Nelly M. Lugo Pina
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Daniela Campos

Gilda Alberty Rangel

Gilda Alberty Rangel

Andres Flores de los Santos
Wendy N. Morano P.
Angela Carreira Z.



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:		https://ifeoroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:		43	
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:		107.50%	
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRAFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
B036	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO
				SUPERVISOR
				ING. FELIPE ÁNGEL GRAJALES JACOME
				FECHA DE ENTREGA
				12/11/2025





IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra (B043) CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO (EDIFICIO B)

Municipio: BENITO JUÁREZ **Localidad:** CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla () **Fondo o Convenio** FAM - FAM BÁSICO 2024.

Siendo las 09:00 horas del día 13 del mes de noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B043) CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO (EDIFICIO B) representada por: **C. PROF. PEDRO JOSÉ MENESES FRANCO** en su carácter de **DIRECTOR DEL PLANTEL**.

Descripción breve de los trabajos OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B: MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento


Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento


CAM. DOLORES FREIXA
C.C.T. 23DML00321
CANCÚN, Q. ROO

PROF. PEDRO JOSÉ MENESES FRANCO
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	4to. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de Infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	43
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
------------	---	---------------------	--	---------------	----

Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
--------------------	---	-------------------------------------	---------

Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.
------------	--

Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ
--------------	---

Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.
--------------------------------	---

Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.
----------------	---

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B043	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO (EDIFICIO B)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN	13/11/2025





IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra (B043) CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO (SUBESTACIÓN).

Municipio: BENITO JUÁREZ **Localidad:** CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla () **Fondo o Convenio** FAM - FAM BÁSICO 2024.

Siendo las 09:00 horas del día 13 del mes de noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B043) CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO (SUBESTACIÓN) representada por: C. PROF. PEDRO JOSÉ MENESES FRANCO en su carácter de DIRECTOR DEL PLANTEL.

Descripción breve de los trabajos OBRA: OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA: ILUMINACIÓN EXTERIOR, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A EDIFICIOS "A" Y "B", SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.


Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

**Entrega por la Ejecutora
IFEQROO**


ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento


CAM. DOLORES FREIXA
C.C.T. 230ML00321
CANCÚN, Q. ROO
PROF. PEDRO JOSÉ MENESES FRANCO
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL







SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:		107.50%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
B043	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO (SUBESTACIÓN)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ
				ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
				13/11/2025

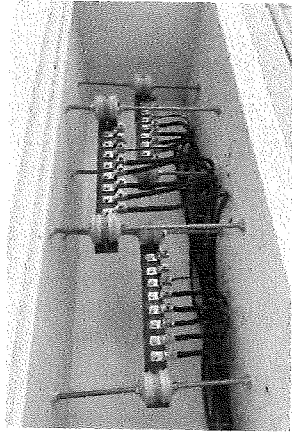



FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(240103) CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL

Cédula y Nombre de la Obra SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO, UBICADA EN
LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

Municipio: BENITO JUÁREZ **Localidad:** CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (☒) Federal (☐) Municipal (☐) Mezcla (☐) **Fondo o Convenio** FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL PARA LAS
ENTIDADES (FISE)
2024

Siendo las 09:00 horas del día 13 del mes de noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (240103) CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. representada por: C. PROF. PEDRO JOSÉ MENESES FRANCO en su carácter de DIRECTOR DEL PLANTEL.

Descripción breve de los trabajos OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A: CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO PRINCIPAL.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento


Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

PROF. PEDRO JOSÉ MENESES FRANCO
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

CAM. DOLORES FREIXA
C.C.T. 230ML00321
CANCÚN, Q. ROO




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C001ACT01



INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/		
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de Infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	C001ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:		107.50%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
240103	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO	CANCÚN	BENITO JUÁREZ
				ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
				13/11/2025

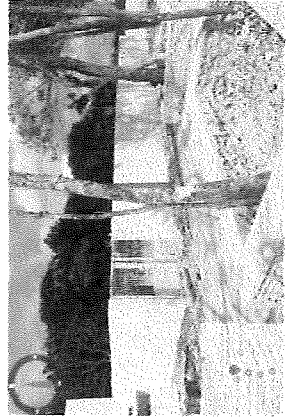



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra (B043) CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO (OBRA EXTERIOR)

Municipio: BENITO JUÁREZ **Localidad:** CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla () **Fondo o Convenio** FAM - FAM BÁSICO 2024.

Siendo las 09:00 horas del día 13 del mes de noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANJA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B043) CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO (OBRA EXTERIOR) representada por: C. PROF. PEDRO JOSÉ MENESES FRANCO en su carácter de DIRECTOR DEL PLANTEL.

Descripción breve de los trabajos OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ASTA BANDERA.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

PROF. PEDRO JOSÉ MENESES FRANCO
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

AM. DOLORES FREIXA
C.C.T. 230ML00321
CANCÚN, Q. ROO






SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:		4to. Trimestre	
Programa Presupuestario:		K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:		https://ifeoroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de Infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:		43	
Indicador:		CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:		21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	
Indicador:		CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Denominador :		40	
Metodo de Cálculo:		(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:		107.50%	
Numerador:		Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.					
Denominador:		Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ					
Descripción de los resultados:		De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.					
Justificación:		Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.					

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B043	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO (OBRA EXTERIOR)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN	13/11/2025

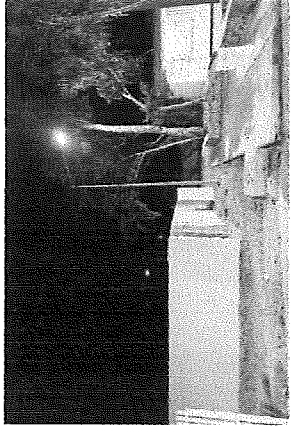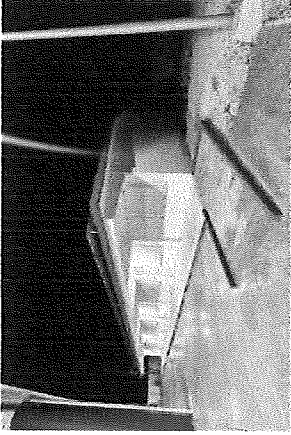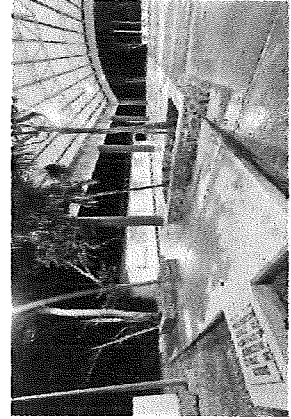



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(240098) CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN EL CENTRO DE

Cédula y Nombre de la Obra

ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO
CIELO NUEVO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO
JUÁREZ.

Municipio: BENITO JUÁREZ

Localidad: CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (☒) Federal (☐) Municipal (☐) Mezcla (☐)

Fondo o Convenio

**FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL PARA LAS
ENTIDADES (FISE)
2024**

Siendo las 09:00 horas del día 13 del mes de noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (240098) CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ representada por: C. PROF. PEDRO JOSÉ MENESES FRANCO en su carácter de DIRECTOR DEL PLANTEL.


Descripción breve de los trabajos OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Lefda la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento


**Entrega por la Ejecutora
IFEQROO**


ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento


CAM. DOLORES FREIXA
C.C.T. 23DML00321
CANCÚN, Q. ROO


PROF. PEDRO JOSÉ MENESES FRANCO
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de Infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	
Metodo de Cálculo:		(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Denominador :	40
Numerador:		Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.		Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
Denominador:		Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:		De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.			
Justificación:		Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.			

REPORTE FOTOGRAFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
240098	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN	13/11/2025





ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables**, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega- Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Cédula y Nombre de la Obra	(B078) EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA BARRERA		
Municipio:	BENITO JUÁREZ	Localidad:	CANCÚN
Origen del Recurso:	Estatad (X) Federal () Municipal () Mezcla ()	Fondo o Convenio:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2025

Siendo las 13:20 horas del día 19 del mes de Noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofia Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa de Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(B078) EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA BARRERA con CCT 23DES0012F**, representada por Luis Cesar Tah Palma, en su carácter de Subdirector del Plantel.

Descripción breve de la acción: (B078) Equipamiento de mobiliario para 4 Aulas Didácticas, en la Secundaria José María Barrera, correspondiente al contrato AD-IFEQROO-FARMARIBE-FAMBAS-ADQ-009/2025.

Beneficiados: 160 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.





Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Luch Cesar, Tah Polmi

Nombre, Cargo y Firma

Sellos

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESC. SEC. GRAL. JOSÉ MARÍA BARRERA
CLAVE: 23DES0012F
Fracc. Saché, Cancun, Quintana Roo

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA BARRERA
LOCALIDAD: CANCUN
MUNICIPIO: BENITO JUAREZ
CEDULA: B078

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
BÁSICO 2025

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	-----------------	----	-------	------	-------

AD-IFEQROO-FARMARIBE-FAMBAS-ADQ-009/2025

4 AULAS DIDÁCTICAS

MOBBJ001	SILLA PARA MAESTRO, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1121	S/N	PZA	4	\$1,869.92	\$ 7,479.68
MOBBJ002	MESA PARA MAESTRO, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1235	S/N	PZA	4	\$7,101.52	\$ 28,406.08
MOBBJ003	SILLA DE PALETA, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1335	S/N	PZA	152	\$2,677.74	\$ 407,017.09
MOBBJ003Z	SILLA DE PALETA ZURDA, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1356	S/N	PZA	8	\$2,677.74	\$ 21,421.95
MOBBJ004	CESTO METALICO, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1085	S/N	PZA	4	\$860.72	\$ 3,442.88
MOB019A	SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 0001	S/N	PZA	3	\$371.20	\$ 1,113.60
MOB019B	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 0001	S/N	PZA	3	\$371.20	\$ 1,113.60
MOB019E	SEÑAL DE EXTINTOR, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 0001	S/N	PZA	3	\$371.20	\$ 1,113.60
MOB020D	SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 0001	S/N	PZA	3	\$426.88	\$ 1,280.64
MOBBJ021	EXTINTOR A, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1001	S/N	PZA	3	\$1,746.96	\$ 5,240.88

TOTAL \$ 477,630.00


ENTREGA

NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO

CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES
ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN

FIRMA: Ana Sofia

SELLO:



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECIBE


NOMBRE: Lucio Cesar Tan Palma
CARGO: Subdirector encargado del plantel

FIRMA:

SELLO:

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESC. SEC. GRAL. JOSÉ MARÍA BARRERA
CLAVE: 23DES0012F
Fracc. Saché, Cancun, Quintana Roo



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B078	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA BARRERA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO	19/11/2025





ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega- Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Cédula y Nombre de la Obra (B079) EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 43 KUSAMIL
Municipio: BENITO JUÁREZ Localidad: CANCÚN
Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla () Fondo o Convenio: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2025

Siendo las 10:29 horas del día 20 del mes de Noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofía Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa de Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(B079) EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 43 KUSAMIL con CCT 23DST0043R**, representada por Ing. Carlos Miguel Sandoval Sánchez, en su carácter de Director Encargado.

Descripción breve de la acción: **(B079) Equipamiento de mobiliario para 5 Aulas Didácticas, en la Secundaria Técnica No. 43 Kusamil, correspondiente al contrato AD-IFEQROO-FARMARIBE-FAMBAS-ADQ-009/2025.**

Beneficiados: 200 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.





Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

[Handwritten signature]
Ing. Carlos Miguel Simental S.
Nombre, Cargo y Firma

Sellos



Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA EN LA SECUNDARIA TECNICA No.43
KUSAMIL.
LOCALIDAD: CANCUN
MUNICIPIO: BENITO JUAREZ
CEDULA: B079

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
BÁSICO 2025

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	-----------------	----	-------	------	-------

AD-IFEQROO-FARMARIBE-FAMBAS-ADQ-009/2025

5 AULAS DIDÁCTICAS

MOBBJ001	SILLA PARA MAESTRO, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1121	S/N	PZA	5	\$1,869.92	\$ 9,349.60
MOBBJ002	MESA PARA MAESTRO, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1235	S/N	PZA	5	\$7,101.52	\$ 35,507.60
MOBBJ003	SILLA DE PALETA, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1335	S/N	PZA	190	\$2,677.74	\$ 508,771.36
MOBBJ003Z	SILLA DE PALETA ZURDA, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1356	S/N	PZA	10	\$2,677.74	\$ 26,777.44
MOBBJ004	CESTO METALICO, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1085	S/N	PZA	5	\$860.72	\$ 4,303.60
MOB019A	SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 0001	S/N	PZA	5	\$371.20	\$ 1,856.00
MOB019B	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 0001	S/N	PZA	5	\$371.20	\$ 1,856.00
MOB019E	SEÑAL DE EXTINTOR, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 0001	S/N	PZA	5	\$371.20	\$ 1,856.00
MOB020D	SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 0001	S/N	PZA	5	\$426.88	\$ 2,134.40
MOBBJ021	EXTINTOR A, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1001	S/N	PZA	5	\$1,746.96	\$ 8,734.80

TOTAL \$ 601,146.80

ENTREGA

NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES
ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN

FIRMA: Ana Sofia

SELLO:



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECIBE

NOMBRE: Ing. Carlos M. Sandoval Sánchez


CARGO: Director encargado.

FIRMA:

SELLO:



DIRECCIÓN
Esc. Sec. Téc. No. 43
C.C.T. 230616043R
Kusamil
Cancún, Quintana Roo



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C001ACT01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	4to. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	43
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	C001ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
------------	---	---------------------	--	---------------	----

Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
--------------------	---	-------------------------------------	---------



Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.
------------	--

Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ
--------------	---

Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.
--------------------------------	---

Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.
----------------	---

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B079	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 43 KUSAMIL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	20/11/2025

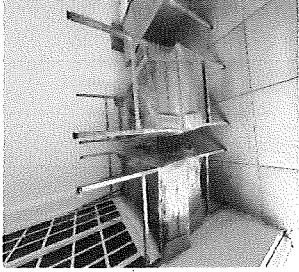



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables**, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega- Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Cédula y Nombre de la Obra (B077) EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA U,NAHIL-XOOC
Municipio: BENITO JUÁREZ Localidad: CANCÚN
Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla () Fondo o Convenio: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2025

Siendo las 11:15 horas del día 20 del mes de Noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofía Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa de Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(B077) EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA U,NAHIL-XOOC con CCT 23DPR0064S**, representada por Raymundo Osvaldo Yah Yan, en su carácter de Director del Plantel.

Descripción breve de la acción: **(B077) Equipamiento de mobiliario para 1 Aula Didáctica, en la Primaria U,Nahil-Xooc, correspondiente al contrato AD-IFEQROO-FARMARIBE-FAMBAS-ADQ-009/2025.**

Beneficiados: 35 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.





Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Ana Sofía

Ing. Ana Sofía Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Director
Raymundo Osvaldo León Yáñez

Nombre, Cargo y Firma

Sellos

SEQ
Servicios Educativos de Quintana Roo
Escuela Primaria U. NAHIL-XOOC TM
C.C.T. 230PR0064S
ZONA ESCOLAR 051L
Benito Juárez Cancún Q. Roo

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA U,NAHIL-XOOC
LOCALIDAD: CANCUN
MUNICIPIO: BENITO JUAREZ
CEDULA: B077

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
BÁSICO 2025

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	--------------	----	-------	------	-------

AD-IFEQROO-FARMARIBE-FAMBAS-ADQ-009/2025

1 AULA DIDÁCTICA

MOBBJ001	SILLA PARA MAESTRO, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1121	S/N	PZA	1	\$1,869.92	\$ 1,869.92
MOBBJ002	MESA PARA MAESTRO, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1235	S/N	PZA	1	\$7,101.52	\$ 7,101.52
MOBBJ003	SILLA DE PALETA, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1335	S/N	PZA	33	\$2,677.74	\$ 88,365.55
MOBBJ003Z	SILLA DE PALETA ZURDA, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1356	S/N	PZA	2	\$2,677.74	\$ 5,355.49
MOBBJ004	CESTO METALICO, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1085	S/N	PZA	1	\$860.72	\$ 860.72
MOB019A	SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 0001	S/N	PZA	1	\$371.20	\$ 371.20
MOB019B	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 0001	S/N	PZA	1	\$371.20	\$ 371.20
MOB019E	SEÑAL DE EXTINTOR, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 0001	S/N	PZA	1	\$371.20	\$ 371.20
MOB020D	SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 0001	S/N	PZA	1	\$426.88	\$ 426.88
MOBBJ021	EXTINTOR A, MARCA: ARGOS, MODELO: MB 1001	S/N	PZA	1	\$1,746.96	\$ 1,746.96

TOTAL \$ 106,840.64

ENTREGA

NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO

CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN

FIRMA: Ana Sofia

SELLO:



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECIBE


NOMBRE: Raymundo Osvaldo Yah Yar

CARGO: Director

FIRMA:

SELLO:

SEQ
Servicios Educativos de Quintana Roo
Escuela Primaria U,NAHIL-XOOC TM
C.C.T. 230PR0064S
ZONA ESCOLAR 051L
Benito Juárez Cancún Q. Roo



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C001ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	C001ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ) *100			Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
Numerador:					
Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.					
Denominador:					
Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ					
Descripción de los resultados:					
De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.					
Justificación:					
Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.					

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
B077	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA U.NAHIL-XOOC	CANCÚN	BENITO JUÁREZ
				ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
				20/11/2025





ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables**, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra
Cédula y Nombre de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(B081) EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA ZAZIL BEH

Municipio: JOSÉ MARÍA MORELOS

Localidad:

HUAY MAX

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio:

FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2025

Siendo las 13:15 horas del día 24 del mes de Noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofia Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa de Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(B070) EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA ZAZIL BEH con CCT 23DCC0086Y**, representada por Karem Gabriela Blanco xool en su carácter de Directora.

Descripción breve de la acción: **(B070) Equipamiento de mobiliario para 1 Aula Didáctica, en la el Preescolar Indígena Zazil Beh, correspondiente al contrato IT-IFEQROO-ESOCAL-FAMBAS-ADQ-005/2025.**

Beneficiados: 30 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Ana Sofia

Ing. Ana Sofía Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Directora
Karem Graciela Blanco xool

Nombre, Cargo y Firma

Sellos

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE
ZAZIL-BEH Z.E. 008
23DCC0086Y
HUAY MAX, J.M.M., Q. ROO



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA ZAZIL BEH
LOCALIDAD: HUAY MAX
MUNICIPIO: JOSÉ MARÍA MORELOS
CEDULA: B081

PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES
MÚLTIPLES NIVEL
BÁSICO 2025

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	--------------	----	-------	------	-------


IT-IFEQROO-ESOCAL-FAMBAS-ADQ-005/2025

1 AULA DIDÁCTICA

MOB001	SILLA PARA MAESTRO, MARCA INEPLATIC, MODELO ISO	S/N	PZA	1	\$ 1,869.92	\$ 1,869.92
MOB002	MESA PARA MAESTRO, MARCA INEPLATIC, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 7,101.52	\$ 7,101.52
MOB022	MUEBLE DE GUARDADO DE MATERIAL DIDÁCTICO, MARCA INEPLATIC, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 10,866.88	\$ 10,866.88
MOB023	MESA PARA JARDÍN DE NIÑOS, MARCA INEPLATIC, MODELO RECTANGULAR	S/N	PZA	15	\$ 1,886.39	\$ 28,295.88
MOB024	SILLA PARA JARDÍN DE NIÑOS, MARCA INEPLATIC, MODELO CONCHA	S/N	PZA	30	\$ 666.42	\$ 19,992.60
MOB004	CESTO METALICO, MARCA INEPLASTIC, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 860.72	\$ 860.72
MOB019A	SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA LEPI SUR, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB019B	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION, MARCA LEPI SUR, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB019E	SEÑAL DE EXTINTOR, MARCA LEPI SUR, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB020D	SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO, MARCA LEPI SUR, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 426.88	\$ 426.88
MOB021	EXTINTOR A, MARCA EXTINFLAM, MODELO ABC	S/N	PZA	1	\$ 1,746.96	\$ 1,746.96

TOTAL \$ 72,274.96

ENTREGA NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN FIRMA: Ana Sofia SELLO:   IFEQROO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	RECIBE NOMBRE: Karen Graciela Blanco xoo CARGO: Directora FIRMA:  SELLO: SEQ SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE ZAZIL-BEH Z.E. 008 23DCC0086Y HUAY MAX, J.M.M. Q. ROO
--	---




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:		https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador:	40
Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%	
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO						
GEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B081	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN EL PREESCOLAR INDÍGENA ZAZIL BEH	HUAY MAX	JOSÉ MARÍA MORELOS	ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO	24/11/2025

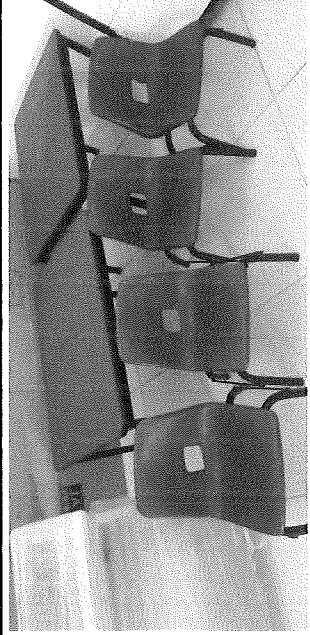



FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(250316) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA U, NAHIL-XOOC, UBICADA EN LA
Cédula y Nombre de la Obra LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

Municipio: BENITO JUÁREZ **Localidad:** CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla () **Fondo o Convenio** FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL PARA LAS
ENTIDADES (FISE) 2025

Siendo las 09:00 horas del día 26 del mes de noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (250316) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA U, NAHIL-XOOC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ representada por: **C. PROF. RAYMUNDO OSWALDO YAH YAM** en su carácter de DIRECTOR DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos : CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA DE 2 E.E. DE 3.24 MTS X 8.00 MTS ADOSADA EN PLANTA ALTA.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO



ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento


PROF. RAYMUNDO OSWALDO YAH YAM
DIRECTOR DEL PLANTEL

SEQ

Servicios Educativos de Quintana Roo
Escuela Primaria U, NAHIL-XOOC TM
C.C.T. 230PR0064S
ZONA ESCOLAR 051L
Benito Juárez Cancún Q. Roo



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01






INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

29.22.12.37

Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador : 40
Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:		107.50%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
250316	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA U.NAHIL-XOOC	CANCÚN	BENITO JUÁREZ
				ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
				26/11/2025

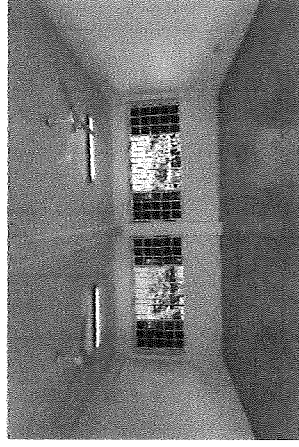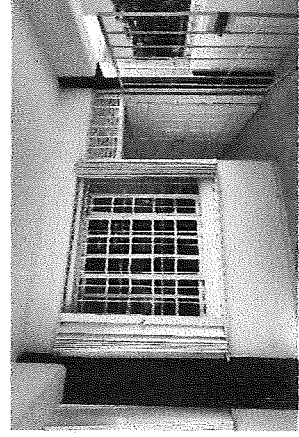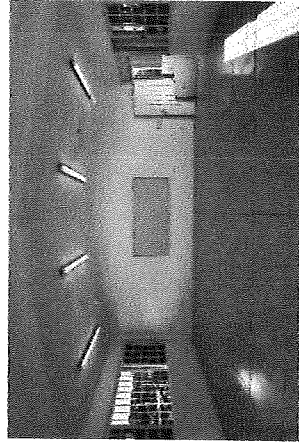



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra (B059) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA RAZA DE BRONCE

Municipio: BENITO JUÁREZ **Localidad:** CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (☒) Federal (☐) Municipal (☐) Mezcla (☐) **Fondo o Convenio** FAM- FAM BASICO 2025

Siendo las 10:00 horas del día 26 del mes de Noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B059) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA RAZA DE BRONCE, representada por: C. _____ en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL.

Descripción breve de los trabajos OBRA: (B059) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA RAZA DE BRONCE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO A, REHABILITACION DE TECHUMBRE Y COLOCACION DE BIODIGESTOR

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.


Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

SEO
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA RAZA DE BRONCE T.V.
CLAVE 23DPR0681J
ZONA ESCOLAR 030
CANCÚN Q. ROO
HECTOR A. GARCIA CORONADO
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	Trimestre:	4to. Trimestre
------------------------	---	------------	----------------

Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
--------------------------	---	----------------------	---

Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	43
--------------------------------	--	------------	----

Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
------------	---	---------------------	--	---------------	----

Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
--------------------	---	-------------------------------------	---------




Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.
------------	--

Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ
--------------	---

Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.
--------------------------------	---

Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.
----------------	---

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B059	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA RAZA DE BRONCE	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. CARLOS EDUARDO CASAR SANDRIA	26/11/2025

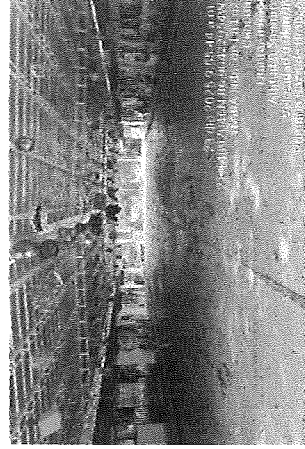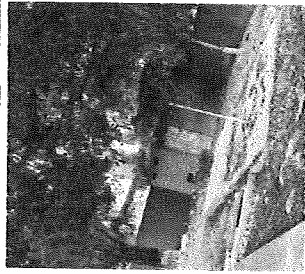



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables**, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega- Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra
Cédula y Nombre de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

(B109) EQUIPAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ FRANCISCO PACHECO TAMAYO

Municipio: LÁZARO CÁRDENAS

Localidad:

EL IDEAL

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio:

FAM-REMANENTES FAM DEL
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN PARA LA
POTENCIACIÓN BÁSICO 2024

Siendo las 12:22 horas del día 26 del mes de Noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofia Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa de Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(B109) EQUIPAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ FRANCISCO PACHECO TAMAYO con CCT 23DTV0121S**, representada por Director Tomas Enrique Castaldi Castillo, en su carácter de Director del plantel.

Descripción breve de la acción: **(B109) Equipamiento para 1 Aula Didáctica, en la Telesecundaria José Francisco Pacheco Tamayo, correspondiente al contrato IT-IFEQROO-SIE-FAMBASREM-ADQ-013/2025.**

Beneficiados: 30 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Director: tomi Enrique Castelli Castelli

Nombre, Cargo y Firma

Sellos




SEQ
SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

JOSÉ FRANCISCO PACHECO TAMAYO T.M.
C.C.T. 23DTV01215
EL IDEAL, L. C., Q. ROO

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ FRANCISCO PACHECO TAMAYO
LOCALIDAD: EL IDEAL
MUNICIPIO: LÁZARO CÁRDENAS
CEDULA: B109

PROGRAMA: FAM-REMANENTES
FAM DEL CONVENIO
DE COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN
PARA LA
POTENCIACIÓN
BÁSICO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	--------------	----	-------	------	-------


IT-IFEQROO-SIE-FAMBASREM-ADQ-013/2025

1 AULA DIDACTICA

MOB001	SILLA PARA MAESTRO, MARCA OFFIHO, MODELO GENOVA	S/N	PZA	1	\$ 1,870.38	\$ 1,870.38
MOB002	MESA PARA MAESTRO, MARCA GORA, MODELO MPM	S/N	PZA	1	\$ 7,102.10	\$ 7,102.10
MOB003	SILLA DE PALETA, MARCA LEGO, MODELO METALUX	S/N	PZA	28	\$ 2,677.63	\$ 74,973.58
MOB003Z	SILLA DE PALETA ZURDA, MARCA LEGO, MODELO METALUX	S/N	PZA	2	\$ 2,677.63	\$ 5,355.26
MOB004	CESTO METÁLICO, MARCA GORA, MODELO 100	S/N	PZA	1	\$ 861.30	\$ 861.30
MOB019A	SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB019B	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACIÓN, MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB019E	SEÑAL DE EXTINTOR, MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB020D	SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO, MARCA MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 426.88	\$ 426.88
MOB020D	SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO, MARCA MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 1,747.54	\$ 1,747.54
MOB025C	PANTALLA LED 43", MARCA LG, MODELO 43UR7800PSB	508RMGC1J879	PZA	1	\$ 12,025.84	\$ 12,025.84

TOTAL \$ 105,476.48

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	NOMBRE: Tomás Enrique Castaldi Castaldi
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN	CARGO: Director
FIRMA: Ana Sofia	FIRMA: [Firma]
SELLO:	SELLO:
   INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	   SEQ SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO JOSÉ FRANCISCO PACHECO TAMAYO T.M. C.C.T. 23DTV01215 EL IDEAL, L. C., Q. ROO






SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.C01-A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ) *100			Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
Numerador:		Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.			
Denominador:		Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ			
Descripción de los resultados:		De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.			
Justificación:		Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.			

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
B109	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ FRANCISCO PACHECO TAMAYO	EL IDEAL	LÁZARO CÁRDENAS
				ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO
				26/11/2025

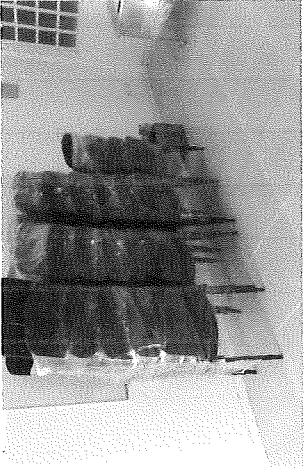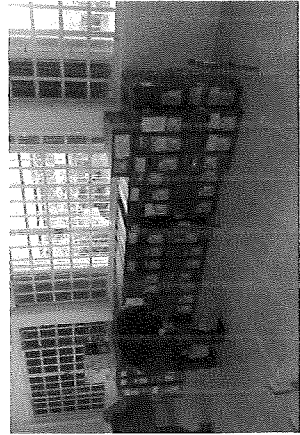



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables**, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega- Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Cédula y Nombre de la Obra	(B111) EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS (TURNO VESPERTINO)		
Municipio:	PLAYA DEL CARMEN	Localidad:	PLAYA DEL CARMEN
Origen del Recurso:	Estatad (X) Federal () Municipal () Mezcla ()	Fondo o Convenio:	FAM-REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN BÁSICO 2024

Siendo las 16:30 horas del día 26 del mes de Noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofía Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa de Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(B111) EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS (TURNO VESPERTINO) con CCT 23DPR0725J**, representada por Elvira García Umón, en su carácter de Directora.

Descripción breve de la acción: (B111) Equipamiento para Dirección, en la Primaria José Vasconcelos (Turno Vespertino), correspondiente al contrato IT-IFEQROO-SIE-FAMBASREM-ADQ-013/2025.

Beneficiados: 148 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.





Entrega-Recepción, Traslado de Dominio, Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento

Ana Sofia

Ing. Ana Sofia Calzada Quijano
Jefa del Departamento de Bienes
Adquiridos en Tránsito y Almacén

Elvira García Limón

Nombre, Cargo y Firma

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"JOSE VASCONCELOS" T.V.
C.C.T. 23DPR0725J
ZONA ESCOLAR 048
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

Sellos

Entrega por la ejecutora
IFEQROO

Recibe para operación, conservación y mantenimiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ
VASCONCELOS (TURNO VESPERTINO)
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN
MUNICIPIO: PLAYA DEL CARMEN
CEDULA: B111

PROGRAMA: FAM-REMANENTES
FAM DEL CONVENIO
DE COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN
PARA LA
POTENCIACIÓN
BÁSICO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
-------	-------------	-----------------	----	-------	------	-------

IT-IFEQROO-SIE-FAMBASREM-ADQ-013/2025

DIRECCIÓN

MOB005	ESCRITORIO SEC, MARCA GORA, MODELO E1P	S/N	PZA	2	\$ 9,340.90	\$ 18,681.80
MOB006	SILLÓN EJECUTIVO, MARCA RED TOP NY, MODELO EJECUTIVO	S/N	PZA	1	\$ 5,254.22	\$ 5,254.22
MOB007	SILLA SECRETARIAL, MARCA COSCOP INDONESIA, MODELO B06572	S/N	PZA	1	\$ 3,671.40	\$ 3,671.40
MOBG016	GABINETE METÁLICO, MARCA GORA, MODELO GB	S/N	PZA	2	\$ 8,703.48	\$ 17,406.96
MOBBJ009	ARCHIVERO METÁLICO, MARCA GORA, MODELO AR-308	S/N	PZA	2	\$ 10,098.96	\$ 20,197.92
MOB010	SILLA APILABLE, MARCA OFFIHO, MODELO GENOVA	S/N	PZA	7	\$ 2,065.96	\$ 14,461.72
MOB011	MESA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS, MARCA GORA, MODELO MJP6	S/N	PZA	1	\$ 19,049.52	\$ 19,049.52
MOB004	CESTO METÁLICO, MARCA GORA, MODELO 100	S/N	PZA	2	\$ 861.30	\$ 1,722.60
MOBBJ012	ASTA DE BANDERA 2.30 M, MARCA EL ARTILLERO, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 1,746.96	\$ 1,746.96
MOBBJ013	BANDERA NACIONAL PARA INTEMPERIE, MARCA EL ARTILLERO, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 3,800.16	\$ 3,800.16
MOBBJ014	BANDERA NACIONAL PARA INTERIORES, MARCA EL ARTILLERO, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 1,349.08	\$ 1,349.08
MOBBJ015	PORTABANDERA, MARCA EL ARTILLERO, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 963.96	\$ 963.96
MOBBJ016	MOÑO PARA BANDERA, MARCA EL ARTILLERO, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 383.96	\$ 383.96
MOBBJ309	COMPUTADORA, MARCA DELL, MODELO PRO 24 ALL-IN-ONE 24"	B1M5DB4	EQUIPO	1	\$ 44,795.40	\$ 44,795.40
MOB019A	SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB019B	SEÑAL DE RUTA DE EVACUACIÓN, MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB019C	SEÑAL DE PRIMEROS AUXILIOS, MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 419.92	\$ 419.92



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO


ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS (TURNO VESPERTINO)
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN
MUNICIPIO: PLAYA DEL CARMEN
CEDULA: B111

PROGRAMA: FAM-REMANENTES
FAM DEL CONVENIO
DE COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN
PARA LA
POTENCIACIÓN
BÁSICO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
MOB019E	SEÑAL DE EXTINTOR, MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 371.20	\$ 371.20
MOB019H	SEÑAL DE NO FUMAR, MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 419.92	\$ 419.92
MOB020D	SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO, MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 426.88	\$ 426.88
MOB021	EXTINTOR A, MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 1,747.54	\$ 1,747.54
MOBBJ031	BOTIQUÍN DE EMERGENCIA, MARCA EXTIN-FLAM, MODELO S/M	S/N	PZA	1	\$ 1,961.88	\$ 1,961.88
TOTAL						\$ 159,575.40

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	NOMBRE: Elvira García Limón
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN	CARGO: Directora
FIRMA: Ana Sofia	FIRMA:
SELLO:	SELLO:
 QUINTANA ROO	 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
	SEQ SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" T.V. C.C.T. 28DPR07251 ZONA ESCOLAR 048 PLAYA DEL CARMEN. QUINTANA ROO






SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43	
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Denominador :	40	
			Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%	
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
B111	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS (TURNO VESPERTINO)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN



FECHA DE ENTREGA

ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO

26/11/2025



ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

TRASLATIVA DE DOMINIO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADQUISICIONES

Con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato de Adquisiciones a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y el Artículo 47 de la Ley Federal de **Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones normativas vigentes aplicables**, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega- Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra

(BT10) ADQUISICIÓN EN LA TELESECUNDARIA JESÚS MARTÍNEZ ROSS

Municipio:

OTHÓN P. BLANCO

Localidad:

CALDERITAS

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio:

FAM-REMANENTES FAM DEL
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN PARA LA
POTENCIACIÓN BÁSICO 2024

Siendo las 13:40 horas del día 27 del mes de Noviembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** representada por la Ing. Ana Sofía Calzada Quijano, en su Carácter de Jefa del Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén, realiza el traslado de dominio, la entrega para su operación, conservación y mantenimiento de la obra **(BT10) ADQUISICIÓN EN LA TELESECUNDARIA JESÚS MARTÍNEZ ROSS con CCT 23DTV0019E**, representada por Prof. Juan Martín Valdez Albornoz, en su carácter de Director de la Escuela.

Descripción breve de la acción: (BT10) Adquisición de mobiliario, en la Telesecundaria Jesús Martínez Ross, correspondiente al contrato IT-IFEQROO-SIE-FAMBASREM-ADQ-013/2025.

Beneficiados: 60 alumnos

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

El **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** declara, que se entregan los manuales e instructivos de operación correspondientes, y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es de doce meses a partir de la firma del presente documento.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OBRA: ADQUISICIÓN EN LA TELESECUNDARIA JESÚS
MARTÍNEZ ROSS
LOCALIDAD: CALDERITAS
MUNICIPIO: OTHÓN P. BLANCO
CEDULA: B110


PROGRAMA: FAM-REMANENTES
FAM DEL CONVENIO
DE COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN
PARA LA
POTENCIACIÓN
BÁSICO 2024


CLAVE	DESCRIPCION	No. DE SERIE	UM	CANT.	P.U.	TOTAL
IT-IFEQROO-SIE-FAMBASREM-ADQ-013/2025						

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO

MOBOPB003	SILLA SECRETARIAL, MARCA COSCORP INDONESIA, MODELO B06572	S/N	PZA	2	\$ 3,816.40	\$ 7,632.80
MOBOPB006	SILLA APILABLE, MARCA OFFIHO, MODELO GENOVA	S/N	PZA	6	\$ 2,181.96	\$ 13,091.76
MOB003	SILLA DE PALETA, MARCA LEGO, MODELO METALUX	S/N	PZA	56	\$ 2,677.63	\$ 149,947.17
MOB003Z	SILLA DE PALETA ZURDA, MARCA LEGO, MODELO METALUX	S/N	PZA	4	\$ 2,677.63	\$ 10,710.51

TOTAL \$ 181,382.24

ENTREGA NOMBRE: ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN FIRMA: Ana Sofia SELLO:   IFEQROO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	RECIBE NOMBRE: Prof. Juan Martín Valdez A CARGO: Director FIRMA: SELLO:  IFEQROO SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESCUELA TELESECUNDARIA "JESÚS MARTÍNEZ ROSS" CLAVE: 23DTV00196 CALDERITAS, Q.R.
---	--



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:		4to. Trimestre	
Programa Presupuestario:		K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:		https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:		43	
Indicador:		CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación		Unidad Responsable:		21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	
Metodo de Cálculo:		(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100		Denominador :		40	
Numerador:		Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.		Porcentaje de Planteles Impactados:		107.50%	
Denominador:		Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ					
Descripción de los resultados:		De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.					
Justificación:		Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.					

REPORTE FOTOGRÁFICO						
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
B110	BÁSICO	EQUIPAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JESÚS MARTÍNEZ ROSS	CALDERITAS	OTHÓN P. BLANCO	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	27/11/2025



**FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**

Con fundamento en el artículos 64 Y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, al art. 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra (250370) CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR K'IMAC'OLAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO **Localidad:** FELIPE CARRILLO PUERTO

Origen del Recurso: Estatal (x) Federal () Municipal () Mezcla () **Fondo o Convenio** Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2026.

Siendo las 09:00 horas del día 02 de Diciembre del año 2025 ; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por la ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de directora de obras y equipamiento, el ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra (250370) CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR K'IMAC'OLAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. representada por la profesor (a) SANDY EK CRUZ en su carácter de DIRECTORA DEL PLANTEL.

Descripción breve de los trabajos:
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.

El INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de vicios ocultos a partir de la firma del acta de entrega-recepcion por obras y servicios por contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

IFEQROO

Arq. Jorge Efraín Calderón Llanes
Residente de Obra

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

PROFRA. SANDY EK CRUZ
Directora

SEQ


SERVICIOS EDUCATIVOS DE
QUINTANA ROO
JARDÍN DE NIÑOS
"KIMACOLAL"
C.C.T. 23DJN0228V
ZONA ESCOLAR 04
FELIPE CARRILLO PUERTO
QUINTANA ROO

Kinverli A. Ek Ramirez
Kinverli Amairani
Ek Ramirez

Fernando Rael
Pech Sakzan
SEQ FCP.

M^o Wilma Chi C.
Maria Wilma Chi Camal.

2-E-004
Anahi Chastel Pino Velasco
Hitzi Zugelly xiu Pacat



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C001ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifegroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/		
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	C001ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentran beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
250370	BÁSICO	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR K1 MAC'OLAL	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO
				SUPERVISOR
				ARQ. JORGE EFRAÍN CALDERÓN LLANES
				FECHA DE ENTREGA
				02/12/2025





QUINTANA ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra

(B100) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO

Municipio:

BENITO JUÁREZ

Localidad:

CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (☒) Federal (☐) Municipal (☐) Mezcla (☐)

Fondo o Convenio

FAM- REMANENTES FAM
DEL CONVENIO DE
COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN PARA LA
POTENCIACIÓN BÁSICO
2025

Siendo las 10:00 horas del día 15 del mes de diciembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B100) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO representada por: C. Eddie Rafael Ojeda Colli en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: DESMANTELAMIENTO Y DESALOJO DE TECHUMBRE EN MAL ESTADO.

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento


Entrega por la Ejecutora
IFEQROO

ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
GUILLERMO PRIETO
CCT 23DPR00705
SECTOR 03
CANCUN QUINTANA ROO





SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C001ACT01



INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:		https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.C01.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	C001ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
Método de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
B100	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	CANCÚN	BENITO JUÁREZ
				ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
				15/12/2025

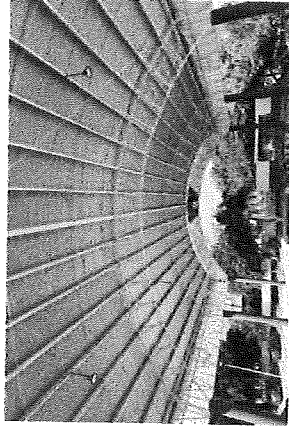



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO DE ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana Roo, al artículo 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes y aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra (B102) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ

Municipio: BENITO JUÁREZ

Localidad: CANCÚN

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

**FAM- REMANENTES FAM
DEL CONVENIO DE
COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN PARA LA
POTENCIACIÓN BÁSICO
2025**

Siendo las 10:00 horas del día 15 del mes de diciembre del año 2025; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO, asistido por ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra: (B102) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ representada por: C. Hiram Benjamin K. Roca en su carácter de DIRECTOR(A) DEL PLANTEL

Descripción breve de los trabajos OBRA: REHABILITACIÓN DE 1 AULA DE CLASE (APLANADOS Y PINTURA).

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como presupuesto definitivo, contrato y/o convenios. Y manifiesta que empezara la vigencia de la Fianza de Vicios Ocultos a partir de la firma del Acta de Entrega-Recepción obras y Servicios por Contrato.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.


Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

**Entrega por la Ejecutora
IFEQROO**

ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
RESIDENTE DE OBRA

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ T.A.
C.O.T. 250PR0303C
ZONA ESCOLAR 030
CANCÚN, Q. ROO
HIRAM BENJAMIN K. ROCA
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL




SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01



Dependencia / Entidad:		2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:		https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:		F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles		Numerador:	43
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentran beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO				
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO
B102	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ
				ING. DANIEL EDUARDO CEN CEN
				15/12/2025

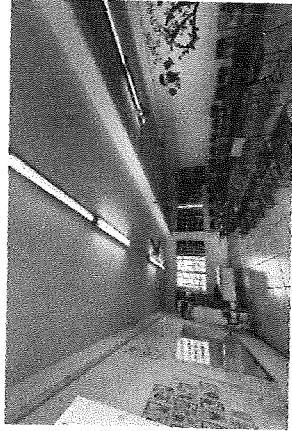

**FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**

Con fundamento en el artículos 64 Y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, al art. 135 de su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cédula y Nombre de la Obra (B119) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA INDÍGENA LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: TRAPICH

Origen del Recurso: Estatal (X) Federal () Municipal () Mezcla ()

Fondo o Convenio

FAM-REMANENTES-FAM
DEL CONVENIO DE
COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN PARA LA
POTENCIACIÓN BÁSICO
2025

Siendo las 10:00 horas del día 16 de diciembre del año 2025 ; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO representada por la ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH en su carácter de Jefa del departamento de seguimiento y calidad de obra y encargada de la dirección de obras y equipamiento, el ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES en su carácter de RESIDENTE DE OBRA, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra (B119) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA INDÍGENA LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TRAPICH DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. representada por la profesor (a) VICTOR GONZALEZ CHAN en su carácter de DIRECTOR.

Descripción breve de los trabajos:

REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A Y D: APLICACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA.

El INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Y manifiesta que cuenta con el acta de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es al 16 DE DICIEMBRE DE 2026.

Léida la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

IEEQROO

Arq. Jorge Efraín Calderón Llanes
Residente de Obra

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

PROFR. VICTOR GONZALEZ CHAN
Director


SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE
LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ Z. E. 00

23DPB0041G

TRAPICH E C P O R O O



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT01

Dependencia / Entidad:		212118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	4to. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2023/		
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.CO1.A01 - Atención de las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles	Numerador:	43		
Indicador:	CO01ACT01 - Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	Unidad Responsable:	2121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	40
Metodo de Cálculo:	(Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente / Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ)*100	Porcentaje de Planteles Impactados:	107.50%		
Numerador:	Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente.				
Denominador:	Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ				
Descripción de los resultados:	De acuerdo al método de cálculo los 43 Planteles entregados beneficiados con acciones de Construcción, Rehabilitación o Equipamiento en el ciclo escolar correspondiente entre los 40 que son el Total de Planteles que se encuentren beneficiados en el Programa Anual de Obra Pública emitido por la SEQ, y ya el resultado obtenido de 1.075 se multiplica por 100 para obtener 107.50% de Porcentaje de Planteles Impactados.				
Justificación:	Para el cuarto y último trimestre se obtuvo 43 actas de planteles entregados beneficiados con acciones de construcción, rehabilitación o equipamiento, en donde el total de planteles entregados que se debían de encontrar beneficiados eran de 40, por lo tanto sobrepasamos la meta y se cumplió exitosamente.				

REPORTE FOTOGRÁFICO					
CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR
B119	BÁSICO	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA INDÍGENA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ	TRAPICH	FELIPE CARRILLO PUERTO	ARQ. JORGE EFRAÍN CALDERÓN LLANES
					FECHA DE ENTREGA
					16/12/2025

